

豊島廃棄物等処理事業の実施状況(平成27年4月末まで)について

1 豊島廃棄物等の処理量

(単位:トン)

区分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	H15~H26 計	平成27年度 (暫定)	累計
計 画 量	35,420	60,000	60,000	60,000	62,500	62,000	71,560	71,097	71,713	77,785	81,211	88,429		5,448	
処 理 量	26,681	53,298	54,026	52,221	54,227	60,597	70,153	74,943	70,995	71,599	80,654	71,055	740,449	6,682	
処理量/計画量 (注) 75.3%	88.8%	90.0%	87.0%	86.8%	97.7%	98.0%	105.4%	99.0%	92.0%	99.3%	80.4%	92.4%	122.7%		
処理量/全体量	2.9%	5.8%	5.9%	5.7%	5.9%	6.6%	7.6%	8.2%	7.7%	7.8%	8.8%	7.7%	80.5%	0.7%	

- 1) 処理量 = 中間処理施設における処理実績 + 岩石等特殊前処理(水洗) + 直下汚染土壌処理実績
- 2) (注)の平成15年度の計画量は、平成15年9月18日(本格稼働)からの計画量で、処理量は試運転期間を含む実績である。
- 3) 全体量は919,252トンである。

2 副成物の発生量及び有効利用量

(単位:トン)

区分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	累計	
鉄	発生量	16.2	30.57	32.32	34.5	321.3	368.4	546.1	672.8	643.9	613.3	625.5	661.3	65.5	5,508.7
	販売量	9.8	31.21	29.68	33.8	353.3	366.5	383.7	517.6	444.5	423.5	525.3	62.0	9.9	4,596.8
銅	発生量	273.0	404.8	450.4	625.7	518.6	492.2	608.6	790.2	850.6	966.4	1,070.9	1,542.5	147.1	8,741.0
	販売量	161.9	50.58	45.73	628.9	507.3	502.3	598.7	741.6	781.9	904.6	955.3	1,376.4	0.0	8,122.0
アルミ	発生量	88.1	48.3	58.1	58.1	215.1	232.3	409.2	291.4	418.4	494.8	487.7	1,266.3	160.5	4,228.3
	再選別	0.0	0.0	0.0	158.5	107.7	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,094.6	1,671.4	133.9	3,204.3
	販売量	30.5	0.0	0.0	15.6	0.0	43.2	28.9	0.0	0.0	0.0	32.8	39.6	0.0	190.6
溶融飛灰	発生量	11,800	2,404.0	2,354.7	1,888.1	2,038.0	2,119.5	2,413.9	2,862.5	2,501.3	2,662.2	2,377.9	2,212.6	194.3	27,209.0
	処理量	11,800	2,404.0	2,354.7	1,888.1	2,038.0	2,119.5	2,413.9	2,862.5	2,501.3	2,662.2	2,377.9	2,212.6	194.3	27,209.0
溶融スラグ	発生量	110,945	32,398.5	34,705.8	32,114.4	31,428.2	30,751.4	34,851.1	33,842.6	34,708.6	33,949.5	38,016.1	34,784.6	3,273.0	385,918.3
	販売量	0.0	1,624.7	3,207.31	37,664.2	27,010.3	29,541.7	31,127.69	29,187.7	26,594.6	33,889.8	33,552.1	2,908.88	1,927.7	328,051.6
	処理量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,503.8	0.0	1,503.8
粗大スラグ	発生量	-	-	-	1,068.6	2,322.9	5,977.5	6,590.8	5,471.9	5,779.8	5,681.7	7,983.9	11,861.7	1,679.8	54,418.6
	販売量	-	-	-	(1,068.6)	(2,272.9)	(4,654.7)	(4,664.2)	(3,845.1)	(4,609.2)	(3,146.6)	(6,277.1)	(0)	(0)	(30,538.4)
	処理量	-	-	-	-	-	-	1,993.1	2,771.0	1,179.8	1,946.1	1,839.3	1,119.94	1,979.7	22,908.4
シルト状スラグ	発生量	-	-	-	159.1	1,400.0	3,073.9	4,552.4	5,093.3	4,037.9	3,657.0	3,754.0	4,447.9	516.2	30,691.7
	処理量	-	-	-	0.0	1,400.1	2,467.3	4,343.3	4,698.1	3,961.7	3,545.2	3,058.6	4,101.3	376.2	27,951.8
清掃ダスト	発生量	-	-	-	88.2	79.5	175.4	82.0	95.6	61.8	69.3	62.5	54.1	0.0	788.4
	処理量	-	-	-	0.0	167.7	96.8	126.7	129.5	61.8	41.7	43.2	46.2	0.0	713.6
仮置き土	発生量	-	-	-	-	6,210.0	2,690.0	4,410.4	3,633.5	4,095.9	2,564.6	4,157.4	349.2	22,522.0	
	処理量	-	-	-	-	-	2,961.9	4,590.5	3,762.6	4,008.0	2,531.6	5,357.8	918.7	24,131.1	

- 1) 鉄、銅、アルミは一般競争入札により販売。アルミの再選別とは、1次発生したアルミの純度を上げるために、平成18年度～20年度はバッチ処理により、平成25年度からはアルミ選別設備(試運転期間を含む)により、アルミと鉄とスラグに再選別し、除去した鉄とスラグの総量である。なお、再選別した鉄はそのまま副成物(鉄)として取扱い、スラグは、平成18年度～20年度は再溶融処理、平成25年度からはセメント原料として有効利用した。
- 2) 溶融スラグは、上記販売量のほか、試験研究のために2,858.8トン(試運転～平成27年4月)使用した。
- 3) 溶融スラグの処理量とは、鉛含有量が基準値を超過したスラグを粗大スラグと混合しセメントの原料として有効利用した量である。
- 4) 粗大スラグ、シルト状スラグ、清掃ダストの発生量・販売量・処理量は、処理量対策として再溶融を止め、有効利用を開始した以降の数値を記載している。
- 5) 粗大スラグは、混合比を発生量に対してその75%、50%、25%混合したアルカリシリカ反応性試験を実施し、合格したものを平成18年10月から平成26年3月まで有効利用しており、その販売量は溶融スラグの合計販売量の(内数)である。なお、水分の蒸発等により、発生量と販売量・処理量の計は合致しない。
- 6) 粗大スラグの処理量とは、製砂スラグに混合できない粗大スラグを製錬珪砂代替品(平成21年度)やセメントの原料(平成22年度～)として有効利用した量である。
- 7) 溶融スラグ及び粗大スラグの発生量は、破碎・分別する前の銅、アルミ、シルト状スラグを含む。
- 8) 仮置き土の発生量とは、仮置き土を高温熱処理するためロータリーキルン炉に投入した量であり、処理量は高温熱処理の後、セメント原料として有効利用した量である。
- 9) 不溶化ダストは平成19年10月から溶融飛灰と一緒に処理しており、その発生量・処理量とも溶融飛灰に含まれる。

3 見学者数

(単位:人)

区分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	累計
豊島側	3,514	5,489	3,240	2,603	1,922	1,876	1,806	1,561	1,754	1,776	1,914	1,593	66	29,116
直島側	4,935	7,827	5,297	4,114	3,867	3,471	3,673	3,064	1,768	1,957	1,634	1,834	101	43,542
計	8,449	13,316	8,537	6,717	5,789	5,347	5,479	4,625	3,522	3,733	3,548	3,427	167	72,658

豊島処分地の掘削状況について

単位：t

		掘削現場からの搬出量		海上輸送量	直島処理量
		均質化物	仮置土		
4月	計画	4,968	459	6,022 (5,427)	5,427
	実績	6,346	291	7,672 (6,683)	6,610
5月	計画	5,704	476	6,863 (6,180)	6,180

※海上輸送量の値は豊島での溶融助剤添加量を含み、括弧内の値は廃棄物のみの輸送量を示す。

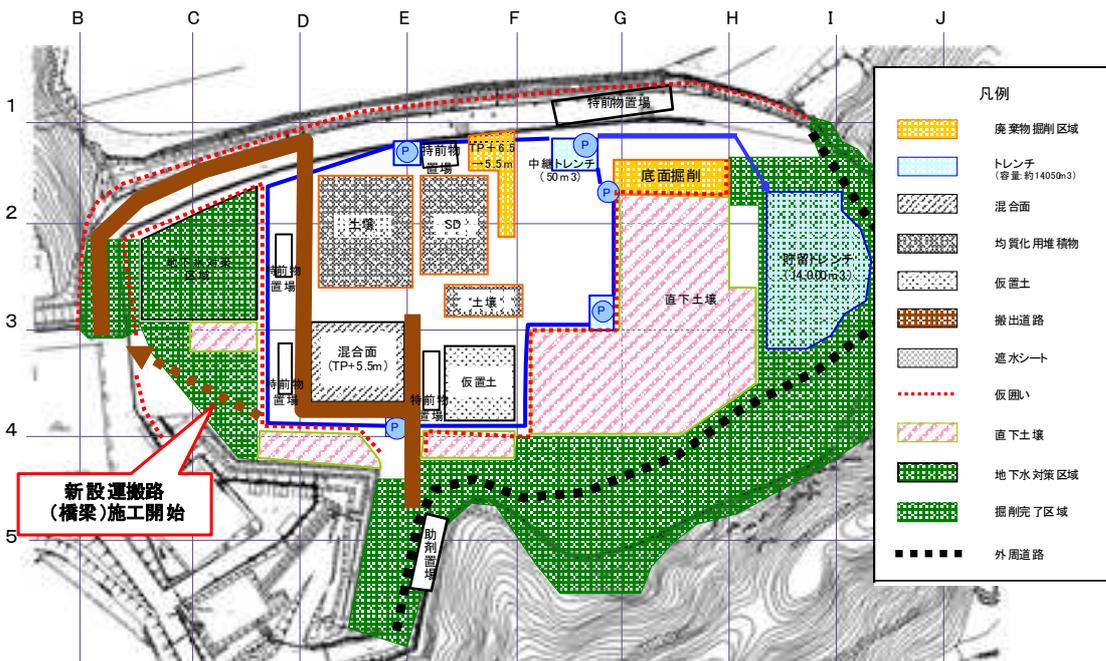


図1 平成27年4月掘削実績

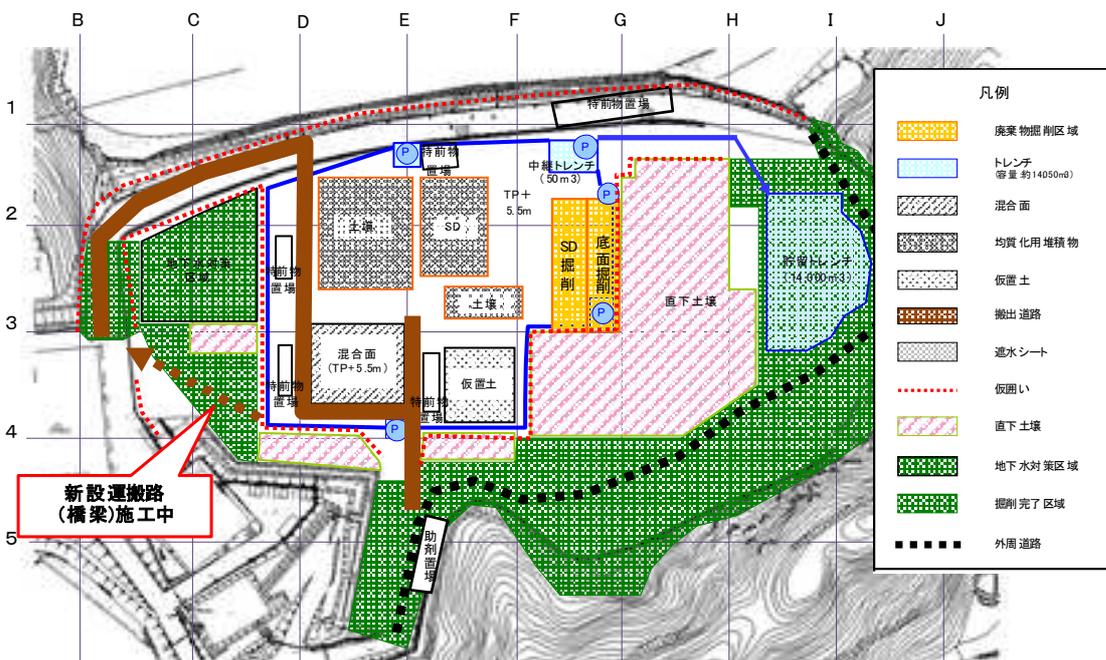


図2 平成27年5月掘削計画
