

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

道路整備による災害に強い県土づくり(防災・安全)(重点)

計画の名称	道路整備による災害に強い県土づくり(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)	交付対象	香川県、高松市、観音寺市
計画の目標	・歩行者・自転車・自動車等の通行者が安全に通行できるように、道路整備による防災・減災対策を行い、災害に強い県土づくりを推進する。		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

事業の実施により、道路を安全に通行できる台数が10,153台増加し、災害時においても利用者が道路を安全に通行できるようになった。

計画の成果目標(定量的指標)	・各事業箇所において、歩道等の整備による歩行者や自転車の通行空間整備や、道路拡幅等による自動車走行空間の整備を行い、災害時においても利用者が安全に通行できるようになる台数(安全通行確保台数)の増加		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	$\frac{\text{安全通行確保率の増加}}{\Sigma(\text{各事業箇所の安全通行確保台数}) / \Sigma(\text{各事業箇所の通行台数})}$			定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値(R2当初) 0% 中間目標値(R4末) 17% 最終目標値(R6末) 100% 達成値: 0% 17% 31%	達成率	備考						
全体事業費	合計(A+B+C)	7,059百万円	A	7,059百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率(事業費ベース)	64%
実施事業費	合計(A+B+C)	4,517百万円	A	4,517百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																		
A 1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)						全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					
1-A1-1	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 鹿庭奥山線(鹿庭北)	現道拡幅 0.3km	三木町							147	147	100%	完了
1-A1-2	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 中徳三谷高松線(香川南)	現道拡幅 0.6km	高松市							350	306	87%	事業費見直しによる完了
1-A1-3	道路	一般	高松市	直接	高松市	(一) 五番町西宝線	自歩道整備 0.3km	高松市							160	46	29%	R3から他計画へ移行し、完了
1-A1-4	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 高松玉越坂出線(乃生東)	現道拡幅 0.5km	坂出市			X	X			1,200	1,052	88%	予算が確保できなかった
1-A1-5	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 193号(西谷)	歩道整備 1.1km	高松市							700	613	88%	用地買収の難航
1-A1-6	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 318号(白鳥)	自歩道整備 0.7km	東かがわ市							530	530	100%	完了
1-A1-7	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 318号(白鳥南)	自歩道整備 0.6km	東かがわ市							500	149	30%	用地買収の難航
1-A1-8	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 志度山川線(前山)	歩道整備 0.4km	さぬき市							250	213	85%	予算が確保できなかった
1-A1-9	道路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	(1) 駅通り池之尻線(坂本橋)	落橋防止 1橋	観音寺市							189	189	100%	完了
1-A1-10	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 193号(中下所)	線形改良 0.6km	高松市							150	70	47%	関係者との調整
1-A1-11	道路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	(他) 側道木之郷本大線外2線	線形改良 1.6km	観音寺市							342	225	66%	予算が確保できなかった
1-A1-12	道路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	(1) 観音寺大野原浜線(梓田跨線橋)	落橋防止 1橋	観音寺市							100	3	3%	他事業を優先的に整備
1-A1-13	道路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	(1) 観音寺大野原線(油井花稲高架橋)	落橋防止 1橋	観音寺市							353	2	1%	他事業を優先的に整備
1-A1-14	道路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	(2) 染川橋観中室本線(染川橋)	落橋防止 1橋	観音寺市							100	1	1%	他事業を優先的に整備
1-A1-15	道路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	(他) 西原南線(西原跨道橋)	落橋防止 1橋	観音寺市							132	12	9%	他事業を優先的に整備
1-A1-16	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 太田上町志度線(六条)	バイパス 1.1km	高松市							1,000	650	65%	用地買収の難航
1-A1-17	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 大野原川之江線(有木)	現道拡幅 0.1km	観音寺市							170	39	23%	地質条件の変更に伴う工法検討
1-A1-18	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 鹿庭奥山線(鹿庭中)	現道拡幅 0.2km	さぬき市							300	70	23%	予算が確保できなかった
1-A1-19	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 観音寺佐野線(有木)	現道拡幅 0.7km	観音寺市							386	200	52%	予算が確保できなかった
合計										7,059	4,517	64%						

B 関連社会資本整備事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					

C 効果促進事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					

その他関連する事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					
合計										0	0							

要素事業の事業進捗
 概ね計画通り進捗
 ・5つの要素事業について、計画通り進捗して完了した。
 ・用地買収難航等の理由により、進捗率が上がらない要素事業もあるが、予算配分に限られる中で効率的に事業が進捗できるよう優先配分等の工夫を行い進捗に努めた。

2. 今後の方針
 継続
 ・引き続き、道路整備による防災・減災対策を行い、災害に強い県土づくりを推進していく。
 ・事業の完了時期や整備効果等により優先順位を精査し、効率的かつ計画的に事業を進める。

事後評価書参考資料

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

道路整備による災害に強い県土づくり(防災・安全)(重点)

位置図

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）


設備による災害に強い県土づくり（防災・安全）

年度～令和6年度（5年間）

交付団体

香川県、高松市、観音寺市

事業箇所図

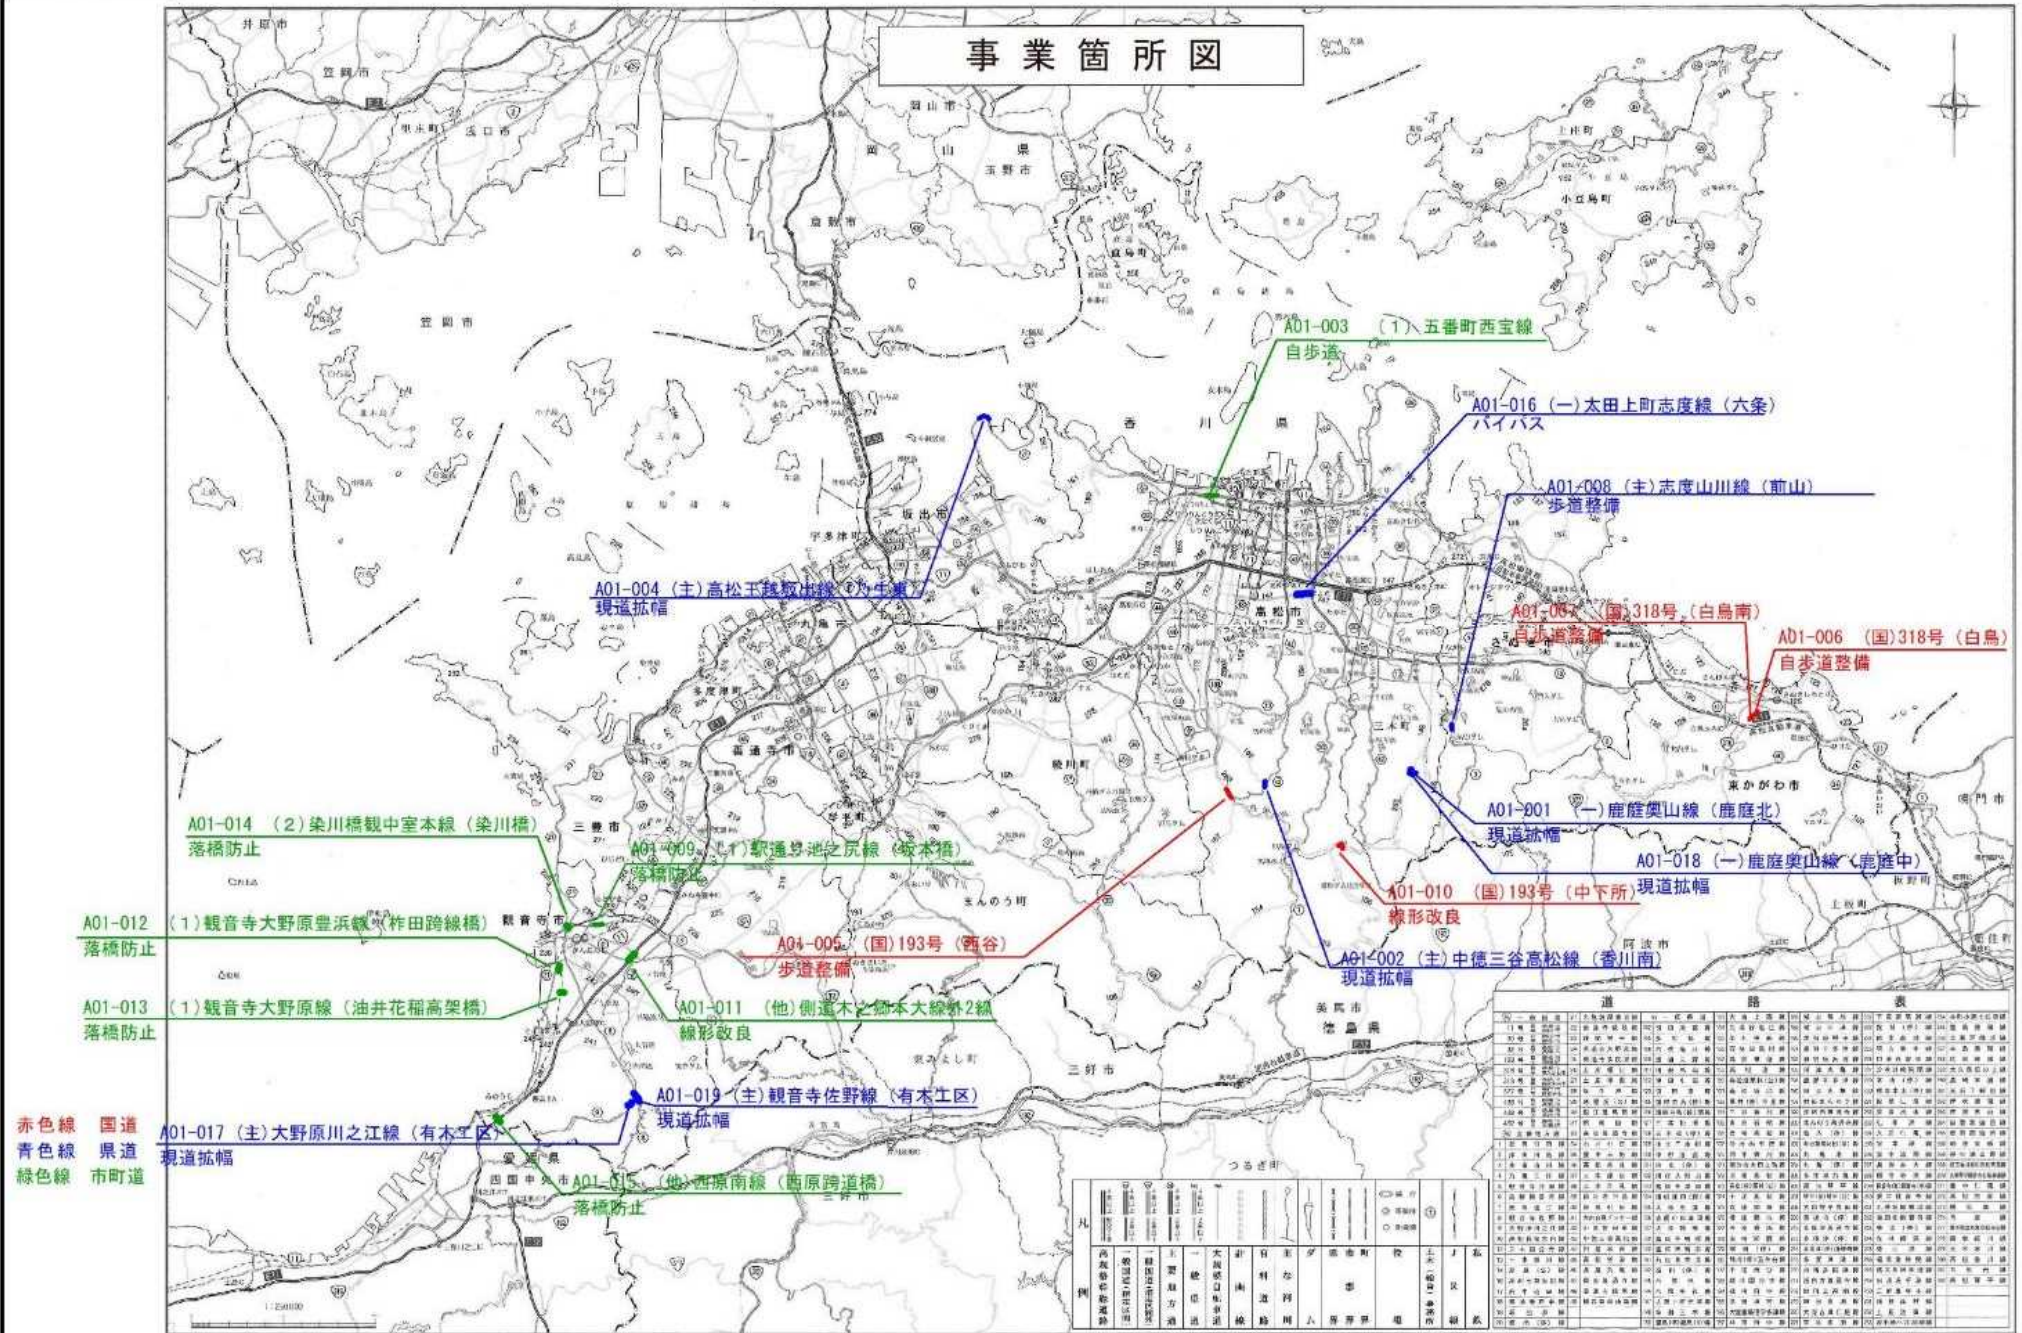

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用し作成したものである。（平29四使 第1号）

事業概要

()は実績

事業内容			計画完了後 整備完了数	残数
内容	箇所数	延長		
現道拡幅	6箇所	L=2.4km	6箇所 (2箇所)	0箇所 (4箇所)
バイパス	1箇所	L=1.0km	1箇所 (0箇所)	0箇所 (1箇所)
線形改良	2箇所	L=2.2km	2箇所 (0箇所)	0箇所 (2箇所)
歩道整備	5箇所	L=3.0km	5箇所 (2箇所)	0箇所 (3箇所)
落橋防止	5橋	5橋	5橋 (1橋)	0橋 (4橋)

事業概要

- ① 現道拡幅
(県道高松王越坂出線(乃生東工区)(坂出市))



- ② バイパス
(太田上町志度線(六条工区)(高松市))



事業概要

③ 歩道整備

(国道318号(白鳥工区)(東かがわ市))



未完了箇所図

事業箇所図

