

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

安全安心で活力のある香川の港づくり（防災・安全）

計画の名称	安全安心で活力のある香川の港づくり（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	香川県
計画の目標	地域物流と海上交通の拠点となる港湾施設の改良を行うことにより、安全安心で活力のある香川の港づくりを行う。		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

- ・港湾施設を改良・補修することにより、港湾施設が安全・安心で効率的に利用できるようになった。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・施設の改良等が必要な港湾施設に対し、対策を実施した港湾施設の割合の向上

定量的指標の定義及び算定式

施設の改良等が必要な港湾施設に対し、対策を実施した港湾施設の割合 対策を実施した港湾施設数/施設の改良等が必要な港湾施設数	目標値:	0%	50%	100%	達成率	22施設/22施設=100% 12施設/22施設=54%	備考
	達成値:			54%			

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,677百万円	A	1,677百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	84%
実施事業費	合計 (A+B+C)	1,410百万円	A	1,410百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R02	R03	R04	R05	R06					
A02-001	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港香西地区・棧橋(-1.0m)の改良	本土工(補修)L=93m	高松港・香西地区						92	92	100%	完了	
A02-002	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港玉藻地区・物揚場(-3.0m)の改良	取付護岸の改良L=12.5m	高松港・玉藻地区						13	13	100%	完了	
A02-003	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港玉藻地区・岸壁(-4.5m)の改良	取付護岸の改良L=25m	高松港・玉藻地区						25	25	100%	完了	
A02-004	港湾	離島	香川県	直接	香川県	宮浦港宮浦地区・浮桟橋の新設	浮桟橋 N=1基	宮浦港・宮浦地区						148	148	100%	完了	
A02-005	港湾	離島	香川県	直接	香川県	直島港本村地区・本村2号 浮桟橋の更新	既設浮桟橋の撤去 N=1基、流用浮桟橋の設置・据付 N=1基	直島港・本村地区						58	58	100%	完了	
A02-006	港湾	離島	香川県	直接	香川県	家浦港家浦地区・浮桟橋の新設	浮桟橋 N=1基	家浦港・家浦地区						255	255	100%	完了	
A02-007	港湾	離島	香川県	直接	香川県	家浦港家浦地区・物揚場(-2.0m)の改良	被覆防食L=50m	家浦港・家浦地区						17	17	100%	完了	
A02-008	港湾	離島	香川県	直接	香川県	土庄港西古浜地区・物揚場(-1.0m)の被覆防食	被覆防食L=107m	土庄港・西古浜地区						19	19	100%	完了	
A02-009	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港玉藻地区・中央埠頭 岸壁(-5.0m)の改良	本土工 L=1 3 2 m	高松港・玉藻地区						312	252	81%	事業費の不足	
A02-010	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港香西地区・西防波堤の改良	本土工L=81m	高松港・香西地区						83	83	100%	完了	
A02-011	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港香西地区・東防波堤の改良	本土工L=29m	高松港・香西地区						20	0	0%	事業費の不足(設計のみ実施済)	
A02-012	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港生島地区・棧橋(-3.0m)の改良	本土工 L=90m	高松港・生島地区						20	0	0%	事業費の不足(単独費にて一部実施)	
A02-013	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港生島地区・防波堤の改良	本土工L=180m	高松港・生島地区						153	121	79%	事業費の不足	
A02-014	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港西浜地区・防波堤(潜掘)の改良	本土工L=56m	高松港・西浜地区						30	8	27%	事業費の不足	
A02-015	港湾	一般	香川県	直接	香川県	高松港香西地区 芝山大橋の耐震化	耐震対策(落橋防止) N=1基	高松港・香西地区						21	0	0%	事業費の不足(単独費にて一部実施)	
A02-016	港湾	離島	香川県	直接	香川県	土庄東港余島地区・岸壁(-6.5m)の改良	本土工L=115m	土庄東港・余島地区						52	35	67%	事業費の不足	
A02-017	港湾	離島	香川県	直接	香川県	内海港安田地区・岸壁(-4.5m)の改良	上部工L=133m	内海港・安田地区						36	20	56%	事業費の不足	
A02-018	港湾	一般	香川県	直接	香川県	志度港原浜地区・防波堤の改良	本土工L=52m	志度港・原浜地区						81	51	63%	事業費の不足	
A02-019	港湾	一般	香川県	直接	香川県	志度港志度地区・物揚場(-2.5m)の改良	本土工L=249m	志度港・志度地区						63	34	54%	事業費の不足	
A02-020	港湾	一般	香川県	直接	香川県	三本松港三本松地区・物揚場(-3.0m)の改良	本土工L=66m	三本松港・三本松地区						54	54	100%	完了	
A02-021	港湾	一般	香川県	直接	香川県	津田港津田地区・岸壁(-4.5m)の改良	本土工L=168m	津田港・津田地区						102	102	100%	完了	
A02-022	港湾	一般	香川県	直接	香川県	白鳥港松原地区・船揚場の改良	本土工L=16m	白鳥港・松原地区						23	23	100%	完了	
小計(港湾事業)											1,677	1,410	84%					
合計											1,677	1,410	84%					

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
C 効果促進事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
その他関連する事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
									合計								


要素事業の事業進捗
 概ね計画通り進捗
 ・進捗率（事業費）は84.1%である。全ての事業箇所について事業着手済みであり、概ね計画通り進捗している。

2. 今後の方針
 継続
 ・新技術活用の検討を行う等コスト削減を図るとともに港湾施設の改良・補修を引き続き行い、安全で安心して利用できる施設の確保を図る。
 ・計画目標通りの予算確保に努める。

■ 事後評価(社会資本総合計画)

安全安心で活力のある香川の港づくり(防災・安全)

位置図

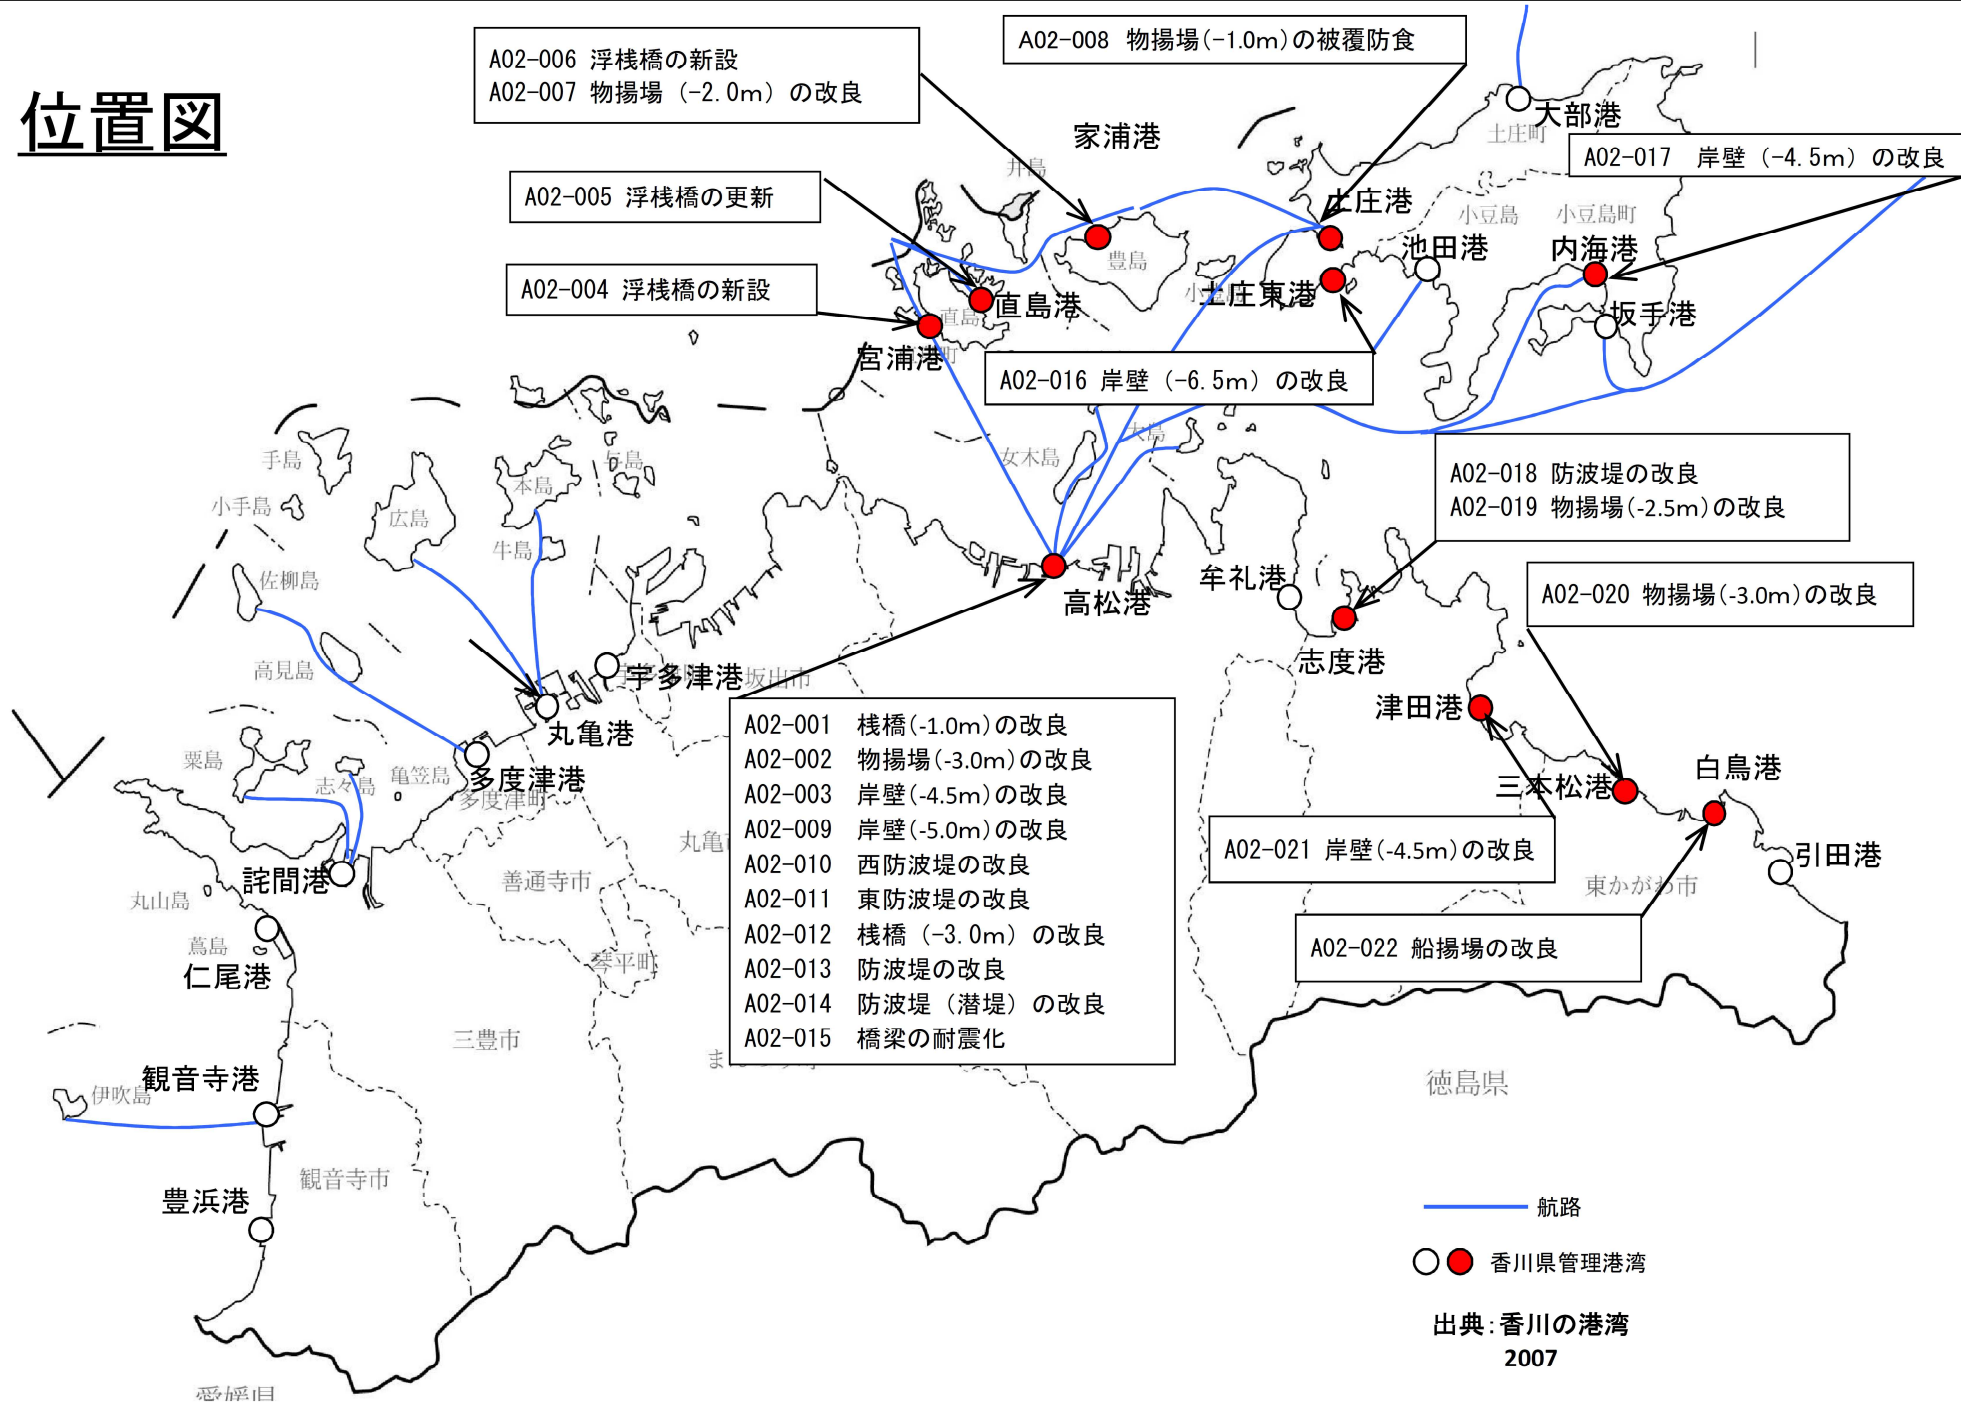


事業概要

施設種別	施設細別	計画数	完了数	残数
係留施設	岸壁	5	1	4
	物揚場	5	5	0
	浮棧橋	3	3	0
	棧橋	2	1	1
	船揚場	1	1	0
	小計		16	11
外郭施設	防波堤	5	1	4
	小計	5	1	4
臨港交通施設	橋梁	1	0	1
	小計	1	0	1
計		22	12	10

事業概要

●係留施設の改良事例～家浦港家浦地区 浮棧橋の新設～


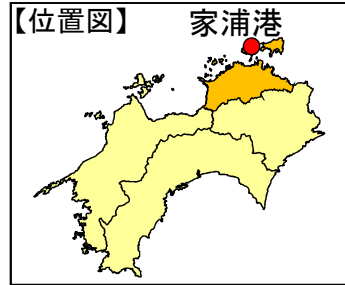


2号浮棧橋



22m

第2浮棧橋(整備前)

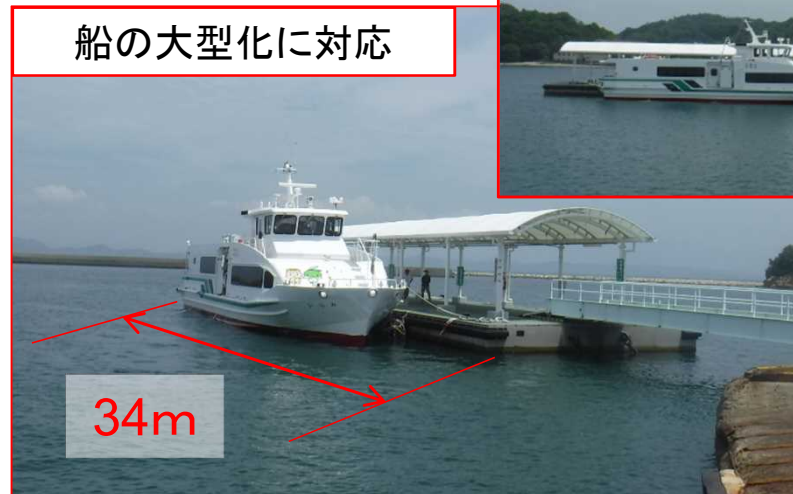



船の大型化に対応

34m


第2浮棧橋(整備後)

事業概要

●外郭施設の改良事例～高松港香西地区・西防波堤の改良～

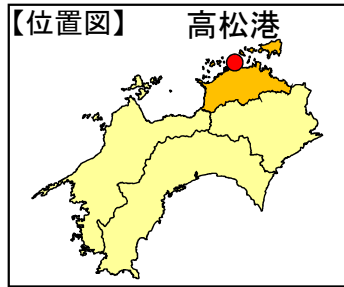

香西西防波堤(整備前)



香西西防波堤(整備後)
