

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

活力のある香川の港づくり

計画の名称	4 活力のある香川の港づくり		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	香川県
計画の目標	港湾労働者、港湾利用者のための広場、遊歩道、緑地等の整備を行うことにより、活力ある港づくりを行う。		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

・ 広場、遊歩道、緑地等の一部が整備完了したことにより、施設整備割合が向上した。

計画の成果目標（定量的指標）										施設整備割合の向上				
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考	
										当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)		
広場、遊歩道、緑地等の施設整備割合の向上 施設整備面積/施設整備予定面積										目標値： 0%	60%	100%	95.0%	= 22,800m ² / 24,000m ²
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,010百万円	A	1,010百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	75%		
実施事業費	合計 (A+B+C)	760百万円	A	760百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.00%				

交付対象事業																	
A.2 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
1-A2-1	港湾	一般	香川県	直接	-	シンボル緑地	A=10,000m ²	高松港・玉藻地区						913	663	73%	予算が確保できなかった
1-A2-2	港湾	一般	香川県	直接	-	休息・修景緑地	A=7,000m ²	高松港・朝日地区	■■■■■					67	67	100%	完了
1-A2-3	港湾	一般	香川県	直接	-	レクリエーション・修景緑地	A=7,000m ²	高松港・香西地区	■■■■■					30	30	100%	完了
小計(港湾事業)												1,010	760	75%			

要素事業の事業進捗

概ね計画通り進捗

・ 進捗率は75.2%であるが、定量的指標の達成率が95%であることから、概ね計画通り進捗している。

2. 今後の方針

継続



・ 遊歩道等の工事を行い、港湾労働者、港湾利用者が利用できる施設整備割合の向上に努める。

事後評価書参考資料

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

活力のある香川の港づくり



位置図

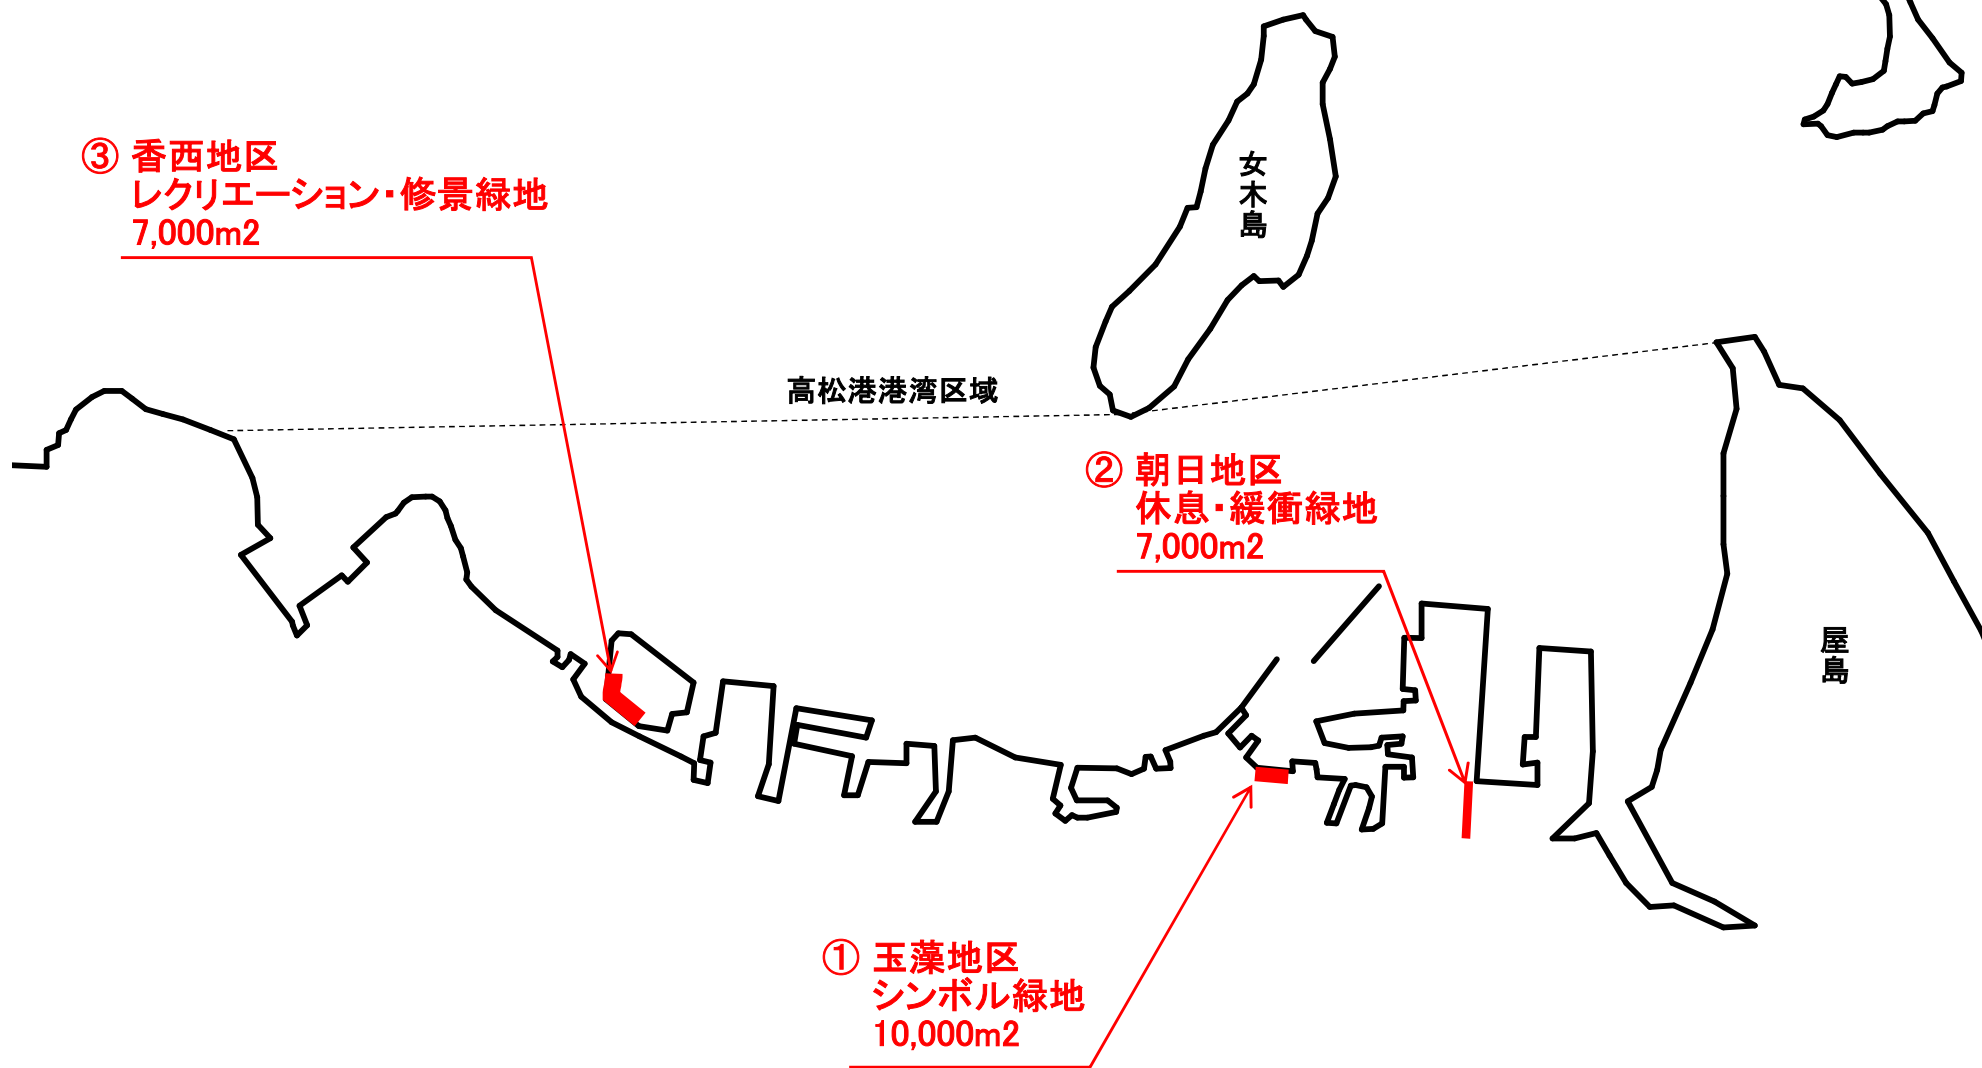

事業概要

①玉藻地区 シンボル緑地

計画: 10,000m² 実施: 8,800m²

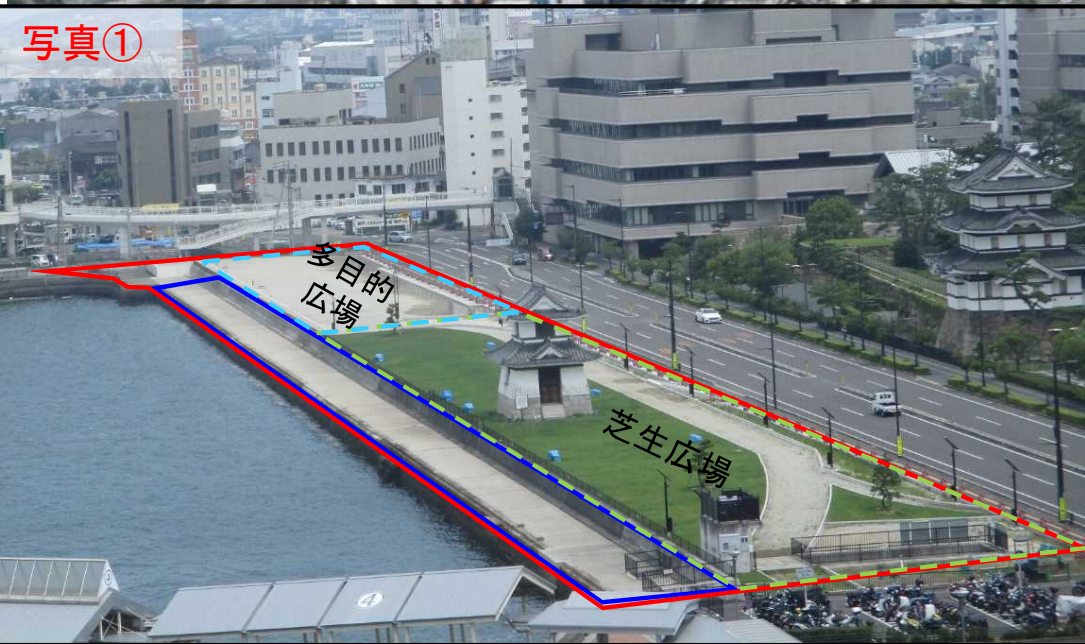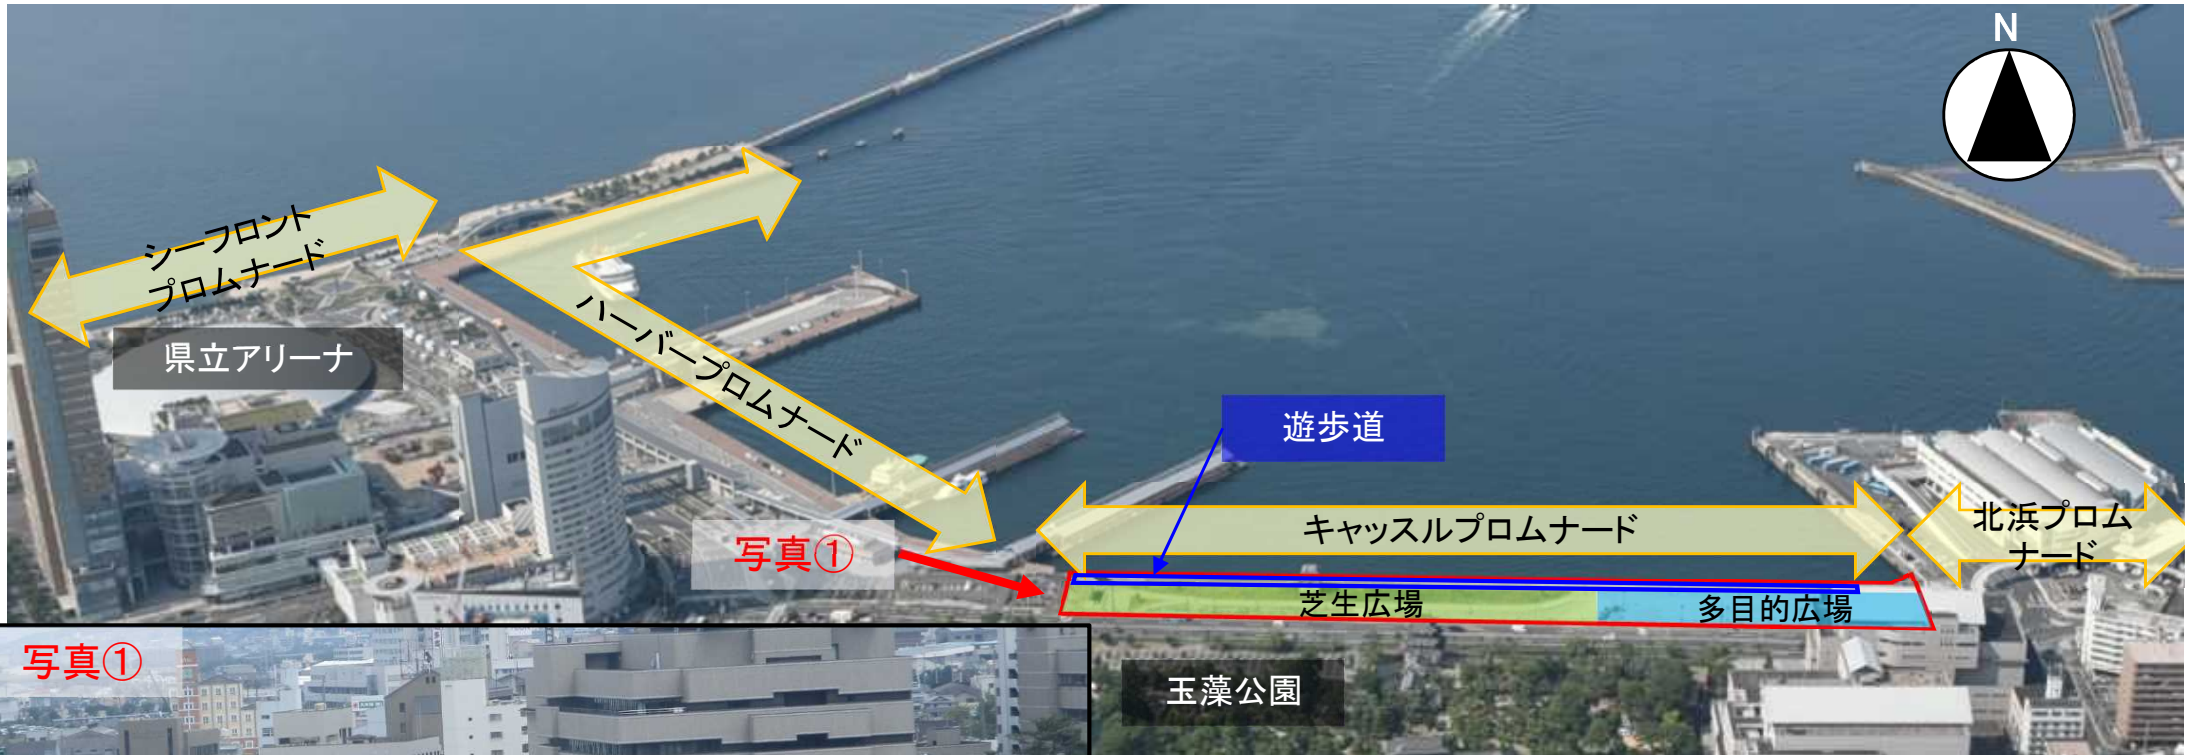

凡例	
	事業箇所
	未整備箇所

事業概要

②朝日地区 休息・緩衝緑地
計画: 7,000m² 実施: 7,000m²



凡例
[Red Outline] 事業箇所

事業概要

③香西地区 レクリエーション・修景緑地
計画: 7,000m² 実施: 7,000m²



写真④

写真⑤



写真④



写真⑤

凡例
[Red Outline] 事業箇所

事業概要

③香西地区 レクリエーション・修景緑地

計画: 7,000m² 実施: 7,000m²

令和5年度利用実績	
パークゴルフ場	利用者数: 20,864人 大会開催回数: 93回
多目的広場	利用者数: 53,969人

パークゴルフ場利用状況



多目的広場利用状況

