

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

安全で安心して利用できる  
公園づくりの推進



計画の名称	安全で安心して利用できる公園づくりの推進			重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）	交付対象	香川県、三豊市	
計画の目標				

県や市が設置する都市公園において、公園施設長寿命化計画が未策定の公園について計画策定を行い、その計画に基づいた公園施設の改築・更新を実施することにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、適切な維持管理を行っていく。

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

- 公園施設の長寿命化計画を策定し、公園施設の長寿命化によるコスト縮減及び計画的な改築・更新・修繕による予算の平準化を行った。
- 長寿命化計画に基づき、計画期間中に改築・更新・修繕を予定していた8箇所の公園のうち、6箇所の公園で施設の改築・更新を行い、公園利用者の安全安心を確保した。

計画の成果目標（定量的指標）

- 公園施設長寿命化計画策定割合の向上
- 公園施設長寿命化計画に基づく更新・改築済み公園数の増加

定量的指標の定義及び算定式

公園施設長寿命化計画の策定率  
 策定率 = 策定済公園数 / 策定予定公園数  
 改築・更新が必要な公園の対策実施率  
 対策実施率 = 改築・更新済公園数 / 改築・更新予定公園数

	定量的指標の現況値及び目標値								達成率	備考			
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (R元末)										
公園施設長寿命化計画の策定率	0%	100%	100%						100%	目標値 18公園/18公園 = 100%			
改築・更新が必要な公園の対策実施率	0%	38%	100%						75%	目標値 8公園/8公園 = 100%			
達成値			100%							達成値 16公園/16公園 = 100%			
達成値			75%							達成値 6公園/8公園 = 75%			
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	733 百万円	A	733 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	進捗率 (事業費ベース)	77%
実施事業費	合計 (A+B+C+D)	568 百万円	A	568 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
A12-001	公園	一般	香川県	直接	香川県	都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定 10箇所 施設の改築・更新 8箇所	高松市外6市町						728	563	77%	事業費不足 (次期計画にて継続)
A12-002	公園	一般	三豊市	直接	三豊市	都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定 8箇所	三豊市						5	5	100%	完了
合計												733	568	77%			

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
該当なし																	

C 効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
該当なし																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率 (%)	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
該当なし																	

要素事業の事業進捗

【概ね計画通り進捗】

- ・予算確保が十分でなかったため、進捗が遅れている事業もあるが概ね計画通り進捗している。

2. 今後の方針

【継続】

- ・公園施設の長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を引き続き行い、安全で安心して利用できる公園の確保を図る。
- ・計画目標通りの予算確保に努める。



## 事後評価書参考資料

### ■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

安全で安心して利用できる  
公園づくりの推進

# 位置図

【事業主体:香川県】


(A12-001)都市公園安全・安心対策事業

- 長寿命化計画策定  
N=10箇所
- 施設の改築・更新  
N=8箇所

【事業主体:三豊市】

(A12-002)都市公園安全・安心対策事業

長寿命化計画策定 N=8箇所

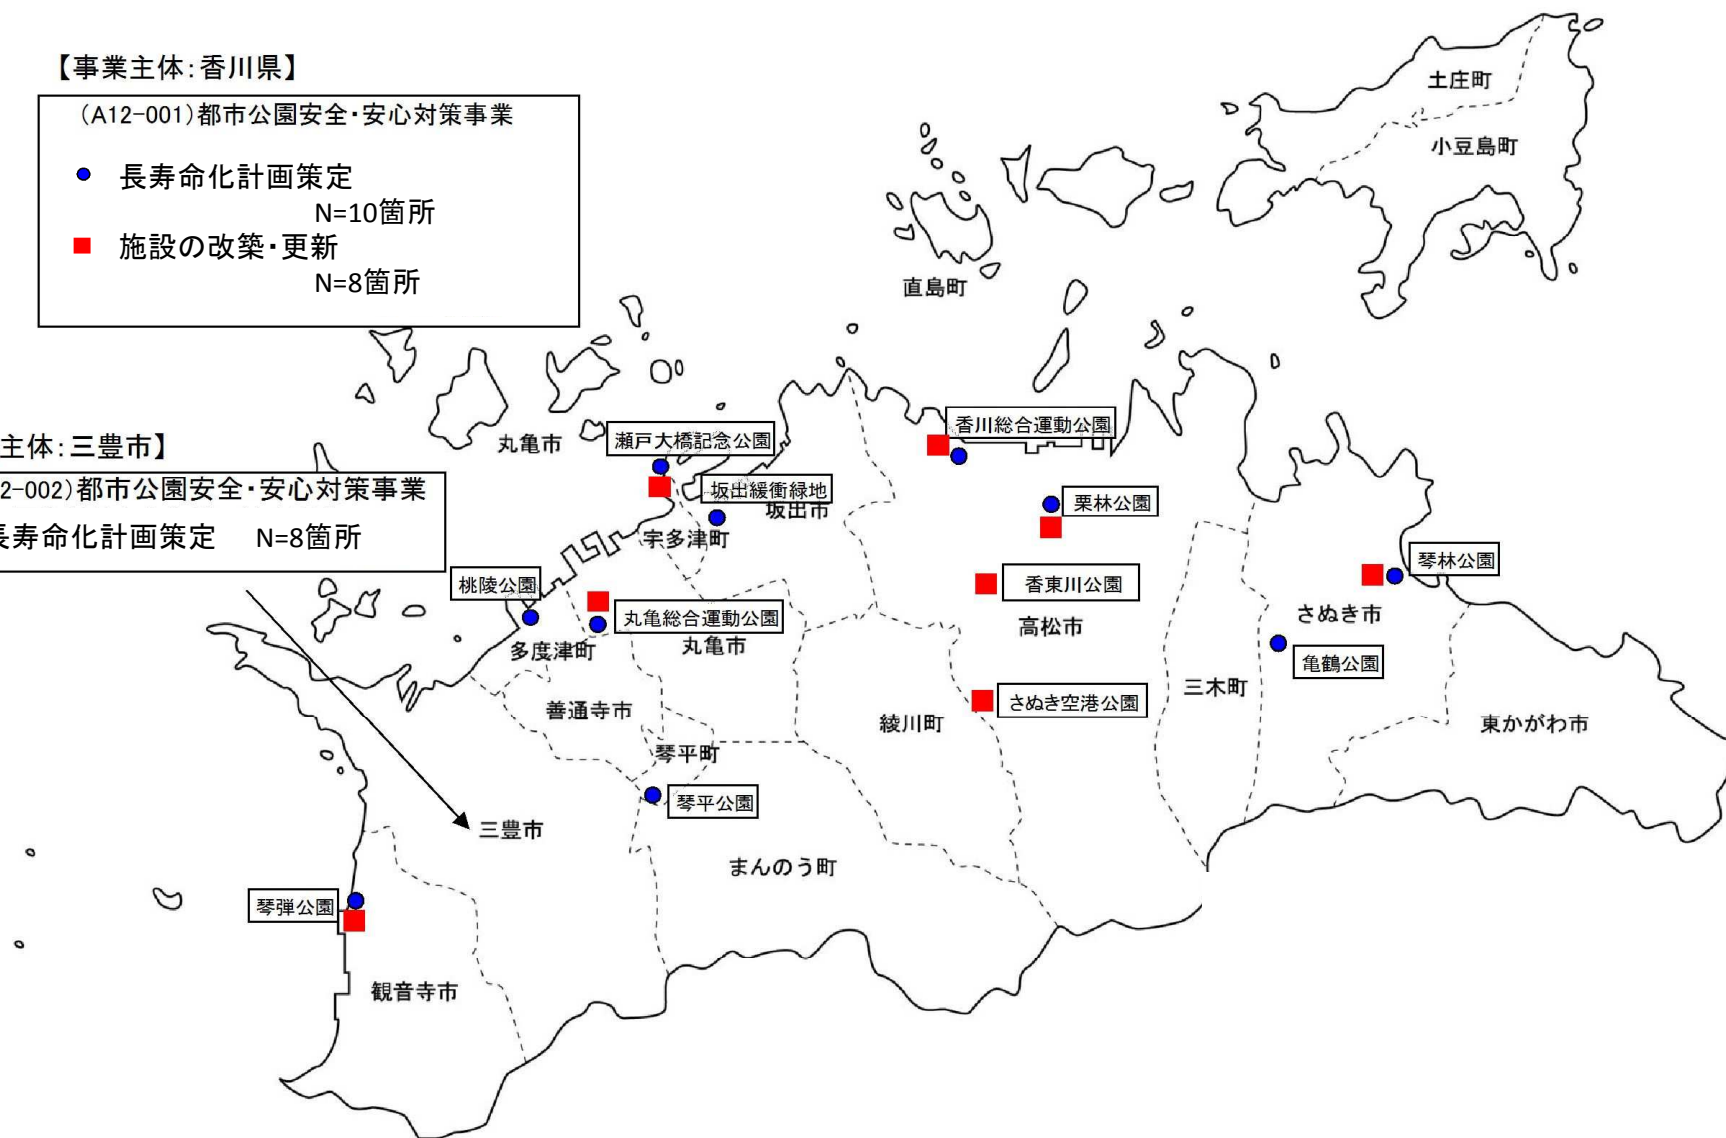

# 事業概要

## ■今回事業の概要(長寿命化計画策定、施設の改築・更新)


今回事業

### ①公園施設ごとの健全度調査(点検の実施)


- ・ベンチや休憩所などの公園施設について、劣化や損傷状況を目視で現地点検し、健全度を4段階に分類

### ②健全度調査結果を踏まえて長寿命化計画を策定

#### ㊦ライフサイクルコストの縮減の検討

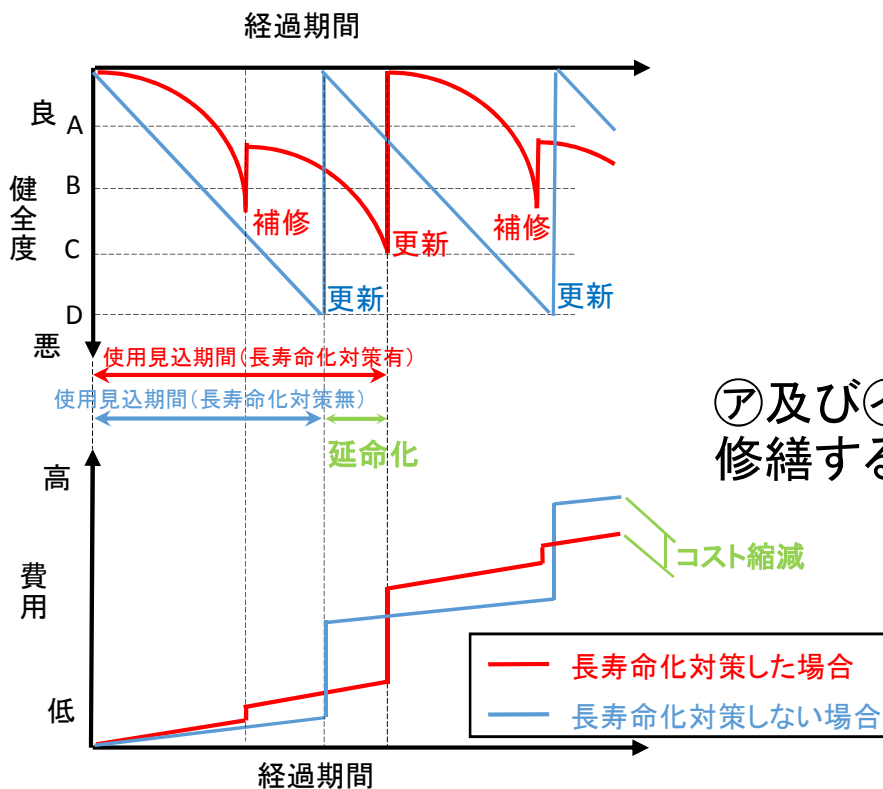

#### ㊧更新・修繕費の平準化

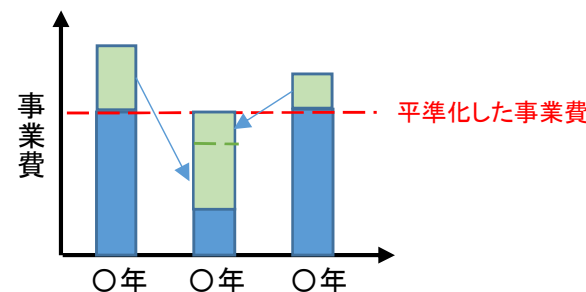

㊦及び㊧を考慮して年度毎の更新・修繕する施設を決定

長寿命化計画策定

県管理10公園

三豊市8公園

③長寿命化計画にもとづく改築・更新・修繕工事の実施

今回事業

施設の改築・更新  
県管理8公園

# 事業概要

## ■長寿命化計画策定(県管理10公園、三豊市8公園)

香川県管理公園 13公園		今回計画(H27~R1)		計画完了後策定済公園数
全体	長寿命化計画策定対象公園数	予定	完了	
		策定予定公園数	策定完了公園数	
香川県総合運動公園	○	○	○	○
丸亀総合運動公園	○	○	○	○
栗林公園	○	○	○	○
瀬戸大橋記念公園	○	○	○	○
琴弾公園	○	○	○	○
桃陵公園	○	○	○	○
坂出緩衝緑地	○	○	○	○
琴林公園	○	○	○	○
亀鶴公園	○	○	○	○
琴平公園	○	○	○	○
さぬき空港公園	○			○
香東川公園	○	策定済	策定済	○
土器川公園	○			○
合計	13	10	10	13

三豊市管理公園 8公園		今回計画(H27~R1)		計画完了後策定済公園数
全体	長寿命化計画策定対象公園数	予定	完了	
		策定予定公園数	策定完了公園数	
仁尾浜児童公園	○	○	○	6
塩生児童公園	○	○	○	
金坂公園	○	○	○	
仁尾公園	○	○	×	
西野近隣公園	○	○	○	
財田川リバーサイドパーク	○	○	×	
不動の滝カントリーパーク	○	○	○	
仁尾海岸緑地	○	○	○	
合計	8	8	6	



# 事業概要

## ■施設の改築・更新(県管理8公園)

県管理公園 13公園	全体		今回計画(H27~R1)					
	改築・更新が必要な公園	改築・更新が必要な公園施設数	予定(ア)		完了(イ)		対策未完了数(ア)-(イ)	
			改築・更新予定公園	計画期間中の改築・更新予定施設数	改築・更新完了公園	計画期間中の改築・更新完了施設数	改築・更新未完了公園	計画期間中の改築・更新未完了施設数
香川県総合運動公園	○	13	○	1	○	1	0	0
丸亀総合運動公園	○	3	○	3	×	2	1	1
栗林公園	○	10	○	5	×	1	1	4
瀬戸大橋記念公園	○	4	○	3	○	3	0	0
琴弾公園	○	47	○	2	○	2	0	0
桃陵公園	○	88	-	-	-	-	-	-
坂出緩衝緑地	○	4	-	-	-	-	-	-
琴林公園	○	66	○	1	○	1	0	0
亀鶴公園	○	71	-	-	-	-	-	-
琴平公園	○	49	-	-	-	-	-	-
さぬき空港公園	○	62	○	7	○	7	0	0
香東川公園	○	9	○	1	○	1	0	0
土器川公園	○	11	-	-	-	-	-	-
合計	13	437	8	23	6	18	2	5

# 未完了箇所位置図

○:未完了箇所

【事業主体:香川県】

(A12-001)都市公園安全・安心対策事業

- 長寿命化計画策定  
N=10箇所
- 施設の改築・更新  
N=8箇所

【事業主体:三豊市】

(A12-002)都市公園安全・安心対策事業  
長寿命化計画策定 N=8箇所



丸亀総合運動公園  
空調設備更新

栗林公園  
讃岐民芸館更新


# 事業概要

## ■公園施設の更新・改築(8公園)

### 【香川県総合運動公園 野球場観客席 床面塗装更新】




【整備前】 観客席床面塗装の劣化



【整備後】



【整備前】 観客席床面塗装の劣化



【整備後】


# 事業概要

## ■公園施設の更新・改築(8公園)

### 【琴林公園 防護柵更新】




【整備前】 木柵腐食状況



【整備後】



【整備前】 木柵腐食状況



【整備後】
