

■ 事後評価（農山漁村地域整備計画）

香川の森林を守り育て活かすプラン

計画の名称 香川の森林を守り育て活かすプラン(第2期)
計画策定主体 香川県
対象市町村 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町(17市町)
計画の期間 平成27年度～令和元年度(5年間)
計画の目標 香川県における森林・林業をとりまく環境は、木材価格の低迷などにより、林業の採算性が悪化し、経済的に林業活動を通じた森林整備を進めることが困難になったことから、森林所有者の経営意欲が減退した結果、間伐などの手入れが行われず放置されたり、竹が侵入するなどの荒廃した森林が増加しており、森林の持つ公益的機能の低下が危惧されている。 このため、荒廃森林の復旧・整備や、施業の集約化・高効率作業による森林所有者の負担の少ない林業生産活動とおした森林の適正管理により、森林の公益的機能の維持増進を図り、山崩れなどの山地災害から生命・財産を保全することによって、県民の安全で安心な生活を確保する。 また、高性能林業機械の導入促進を図るための林道・作業道の基盤整備を行うことにより、木材の素材生産の効率化を図る仕組みづくりを進め、県産材のより一層の利用拡大による森林整備を促進するとともに、間伐材を計画的・安定的に生産する体制を構築することにより、持続可能な循環型社会の創造に寄与し、森林の有する多面的機能の持続的発揮を図る。

事業効果の発現状況 【一定の効果があった】 ・治山事業で谷止工等を設置することにより、山地災害防止機能等が確保され、山地災害から保全される集落が14集落増加した。 ・林道開設事業などの基盤整備を行うことにより、間伐などの森林整備が行われ、県産木材の搬出利用が970m ³ 増加した。
--

定量的指標 (森林整備事業) ・搬出利用される県産木材の年間材積の増加 (3,500m ³ (平成22年度～25年度平均) → 4,700m ³) (治山事業) ・山地災害防止機能等が確保された集落数の増加 (1,027集落(平成26年度末現在) → 1,042集落)
--

定量的指標(達成値) 治山事業: 山地災害防止機能等が確保された集落数の増加 森林整備事業: 搬出利用される県産木材の年間材積	<table border="1"> <tr> <th>当初現況値</th> <th>目標値</th> <th>達成値</th> <th>達成率</th> </tr> <tr> <td>1,027集落</td> <td>1,042集落</td> <td>1,042集落</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>3,500m³</td> <td>4,700m³</td> <td>4,470m³</td> <td>81%</td> </tr> </table>	当初現況値	目標値	達成値	達成率	1,027集落	1,042集落	1,042集落	93%	3,500m ³	4,700m ³	4,470m ³	81%
当初現況値	目標値	達成値	達成率										
1,027集落	1,042集落	1,042集落	93%										
3,500m ³	4,700m ³	4,470m ³	81%										

対象事業 事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	事業実施期間(年間)					計画期間内 の総事業費 (千円)	計画期間内 の総事業費 (千円)	進捗率	備考
							H27	H28	H29	H30	R1				
							[進捗状況の棒グラフ表示]								
森林整備事業	育成林整備事業	琴南財田1号線	香川県	まんのう町	林道開設 225m	林道開設 225m	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	81,211	81,211	100%	
森林整備事業	育成林整備事業	琴南財田3-1号線	香川県	まんのう町	林道開設 1,000m	林道開設 841m	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	330,000	268,501	81%	
森林整備事業	育成林整備事業	琴南財田5-1号線	香川県	まんのう町	林道開設 800m	林道開設 1,100m	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	340,000	358,249	105%	
森林整備事業	育成林整備事業	琴南財田4-2号線	香川県	まんのう町	林道開設 600m	林道開設 550m	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	92,000	106,160	115%	
森林整備事業	林道改良事業	塩江等南線	高松市	高松市	林道改良 1箇所	林道改良 1箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	28,500	28,500	100%	
森林整備事業	林道改良事業	塩江等南線	香川県	高松市	林道改良 1箇所 (指導監督費)	林道改良 1箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	1,280	1,280	100%	
森林整備事業	林道改良事業	塩江等南線	綾川町	綾川町	林道改良 1箇所	林道改良 1箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	90,000	74,194	82%	
森林整備事業	林道改良事業	塩江等南線	香川県	綾川町	林道改良 1箇所 (指導監督費)	林道改良 1箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	3,900	3,276	84%	
森林整備事業	林道改良事業	矢管太郎兵衛線	さぬき市	さぬき市	林道改良 1箇所	林道改良 1箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	90,612	51,904	57%	
森林整備事業	林道改良事業	矢管太郎兵衛線	香川県	さぬき市	林道改良 1箇所 (指導監督費)	林道改良 1箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	3,988	2,304	58%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	八丁線外7路線	高松市	高松市	点検診断 12箇所	点検診断 12箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	3,564	3,564	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	八丁線外7路線	香川県	高松市	点検診断 12箇所 (指導監督費)	点検診断 12箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	156	156	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	有木線外5路線	観音寺市	観音寺市	点検診断 11箇所	点検診断 11箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	3,726	3,726	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	有木線外5路線	香川県	観音寺市	点検診断 11箇所 (指導監督費)	点検診断 11箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	164	164	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	小倉線外4路線	さぬき市	さぬき市	点検診断 10箇所	点検診断 10箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	2,808	2,808	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	小倉線外4路線	香川県	さぬき市	点検診断 10箇所 (指導監督費)	点検診断 10箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	122	122	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	定久線外14路線	東かがわ市	東かがわ市	点検診断 24箇所 保全整備 1箇所	点検診断 24箇所 保全整備 1箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	8,646	8,646	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	定久線外14路線	香川県	東かがわ市	点検診断 24箇所 保全整備 1箇所 (指導監督費)	点検診断 24箇所 保全整備 1箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	382	382	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	田渡谷線外2路線	三豊市	三豊市	点検診断 5箇所	点検診断 5箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	1,566	1,566	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	田渡谷線外2路線	香川県	三豊市	点検診断 5箇所 (指導監督費)	点検診断 5箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	70	70	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	信常線外5路線	綾川町	綾川町	点検診断 7箇所	点検診断 7箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	2,160	2,160	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	信常線外5路線	香川県	綾川町	点検診断 7箇所 (指導監督費)	点検診断 7箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	96	96	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	西谷線外7路線	まんのう町	まんのう町	点検診断 15箇所	点検診断 15箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	4,320	4,320	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	西谷線外7路線	香川県	まんのう町	点検診断 15箇所 (指導監督費)	点検診断 15箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	194	194	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	星ヶ城線外1路線	小豆島町	小豆島町	点検診断 6箇所	点検診断 6箇所	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	2,000	2,001	100%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	星ヶ城線外1路線	香川県	小豆島町	点検診断 6箇所 (指導監督費)	点検診断 6箇所 (指導監督費)	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	[進捗]	90	90	100%	
(森林整備事業) 計												1,091,535	1,005,624		

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	計画期間内 の実施事業内容 (工種及び数量)	事業実施期間(年間)					計画期間内 の総事業費 (千円)	計画期間内 の実施事業費 (千円)	進捗率	備考
							H27	H28	H29	H30	R1				
治山事業	予防治山事業	石引	香川県	東かがわ市	谷止工2個、流路工	谷止工2個、流路工						66,393	66,393	100%	
治山事業	予防治山事業	宗心	香川県	東かがわ市	谷止工2個	谷止工2個						35,741	35,741	100%	
治山事業	予防治山事業	狩居川	香川県	東かがわ市	谷止工1個、流路工	谷止工1個、流路工						82,873	82,873	100%	
治山事業	予防治山事業	川西	香川県	東かがわ市	谷止工2個	谷止工2個						38,959	38,959	100%	
治山事業	予防治山事業	友国	香川県	東かがわ市	谷止工1個、流路工	谷止工1個、流路工						37,420	37,420	100%	
治山事業	予防治山事業	西ヶ谷	香川県	東かがわ市	谷止工1個、流路工	谷止工1個、流路工						26,046	26,046	100%	
治山事業	予防治山事業	大楢	香川県	東かがわ市	谷止工2個	谷止工2個						62,868	63,380	101%	
治山事業	予防治山事業	上裏	香川県	東かがわ市	谷止工1個、流路工	谷止工1個、流路工						37,703	37,703	100%	
治山事業	予防治山事業	友国	香川県	東かがわ市	谷止工3個	谷止工3個						91,198	100,155	110%	
治山事業	予防治山事業	船原	香川県	さぬき市	谷止工1個	谷止工1個						21,137	21,137	100%	
治山事業	予防治山事業	上星越	香川県	さぬき市	谷止工1個、流路工	谷止工1個、流路工						38,689	38,689	100%	
治山事業	予防治山事業	大楸	香川県	さぬき市	谷止工2個	谷止工2個						37,585	37,585	100%	
治山事業	予防治山事業	向井	香川県	さぬき市	谷止工2個、床固工2個外	谷止工2個、床固工2個外						60,816	59,934	99%	
治山事業	予防治山事業	菅谷	香川県	さぬき市	谷止工3個	谷止工2個						15,650	36,626	234%	
治山事業	予防治山事業	南大笹	香川県	さぬき市	山腹工0.38ha	山腹工0.38ha						39,000	32,799	84%	
治山事業	予防治山事業	中下所	香川県	高松市	谷止工4個	谷止工4個						101,313	99,370	98%	
治山事業	予防治山事業	国吉	香川県	丸亀市	谷止工1個、床固工1個	谷止工1個、床固工1個						21,501	21,501	100%	
治山事業	予防治山事業	奥逆瀬	香川県	観音寺市	谷止工2個、流路工	谷止工2個、流路工						41,000	47,445	116%	
治山事業	予防治山事業	石内	香川県	綾川町	谷止工2個	谷止工2個						24,624	24,624	100%	
治山事業	予防治山事業	高山	香川県	綾川町	谷止工1個	谷止工1個						37,777	37,716	100%	
治山事業	予防治山事業	青浦	香川県	綾川町	谷止工2個	谷止工2個						18,824	18,824	100%	
治山事業	予防治山事業	東開	香川県	綾川町	谷止工1個	谷止工1個						19,000	19,000	100%	
治山事業	予防治山事業	合谷	香川県	三豊市	床固工3個	床固工3個						25,280	25,280	100%	
治山事業	予防治山事業	不老谷	香川県	三豊市	谷止工4個	谷止工4個						60,717	60,717	100%	
治山事業	予防治山事業	桁	香川県	三豊市	谷止工4個、床固工1個外	谷止工4個、床固工1個外						58,176	58,176	100%	
治山事業	予防治山事業	不老谷	香川県	三豊市	谷止工2個	谷止工2個						35,849	32,065	89%	
治山事業	予防治山事業	砂古	香川県	三豊市	谷止工1個、流路工	谷止工1個、流路工						31,700	32,196	102%	
治山事業	予防治山事業	城山	香川県	まんのう町	谷止工4個	谷止工4個						86,247	87,550	102%	
治山事業	予防治山事業	裏谷	香川県	まんのう町	谷止工2個、流路工	谷止工2個、流路工						65,000	54,844	84%	
治山事業	予防治山事業	向山	香川県	土庄町	落石防護工57m	落石防護工57m						60,000	60,000	100%	
(治山事業)計												1,379,066	1,394,728	101%	
合計 (全体事業費)												2,470,601	2,400,352		
要素事業の進捗状況 概ね計画通り進捗 ・進捗率 97% ・予算確保が十分でなかったため進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。															
今後の方針 継続 今後とも、費用対効果や事業実施の優先度、事業効果の発現状況等を総合的に判断し、関係市町等との連携を図りながら、次期計画の着実な進捗に努める。															


事後評価書参考資料

■ 事後評価（農山漁村地域整備計画）

香川の森林を守り育て活かすプラン

みどり整備課

位置図

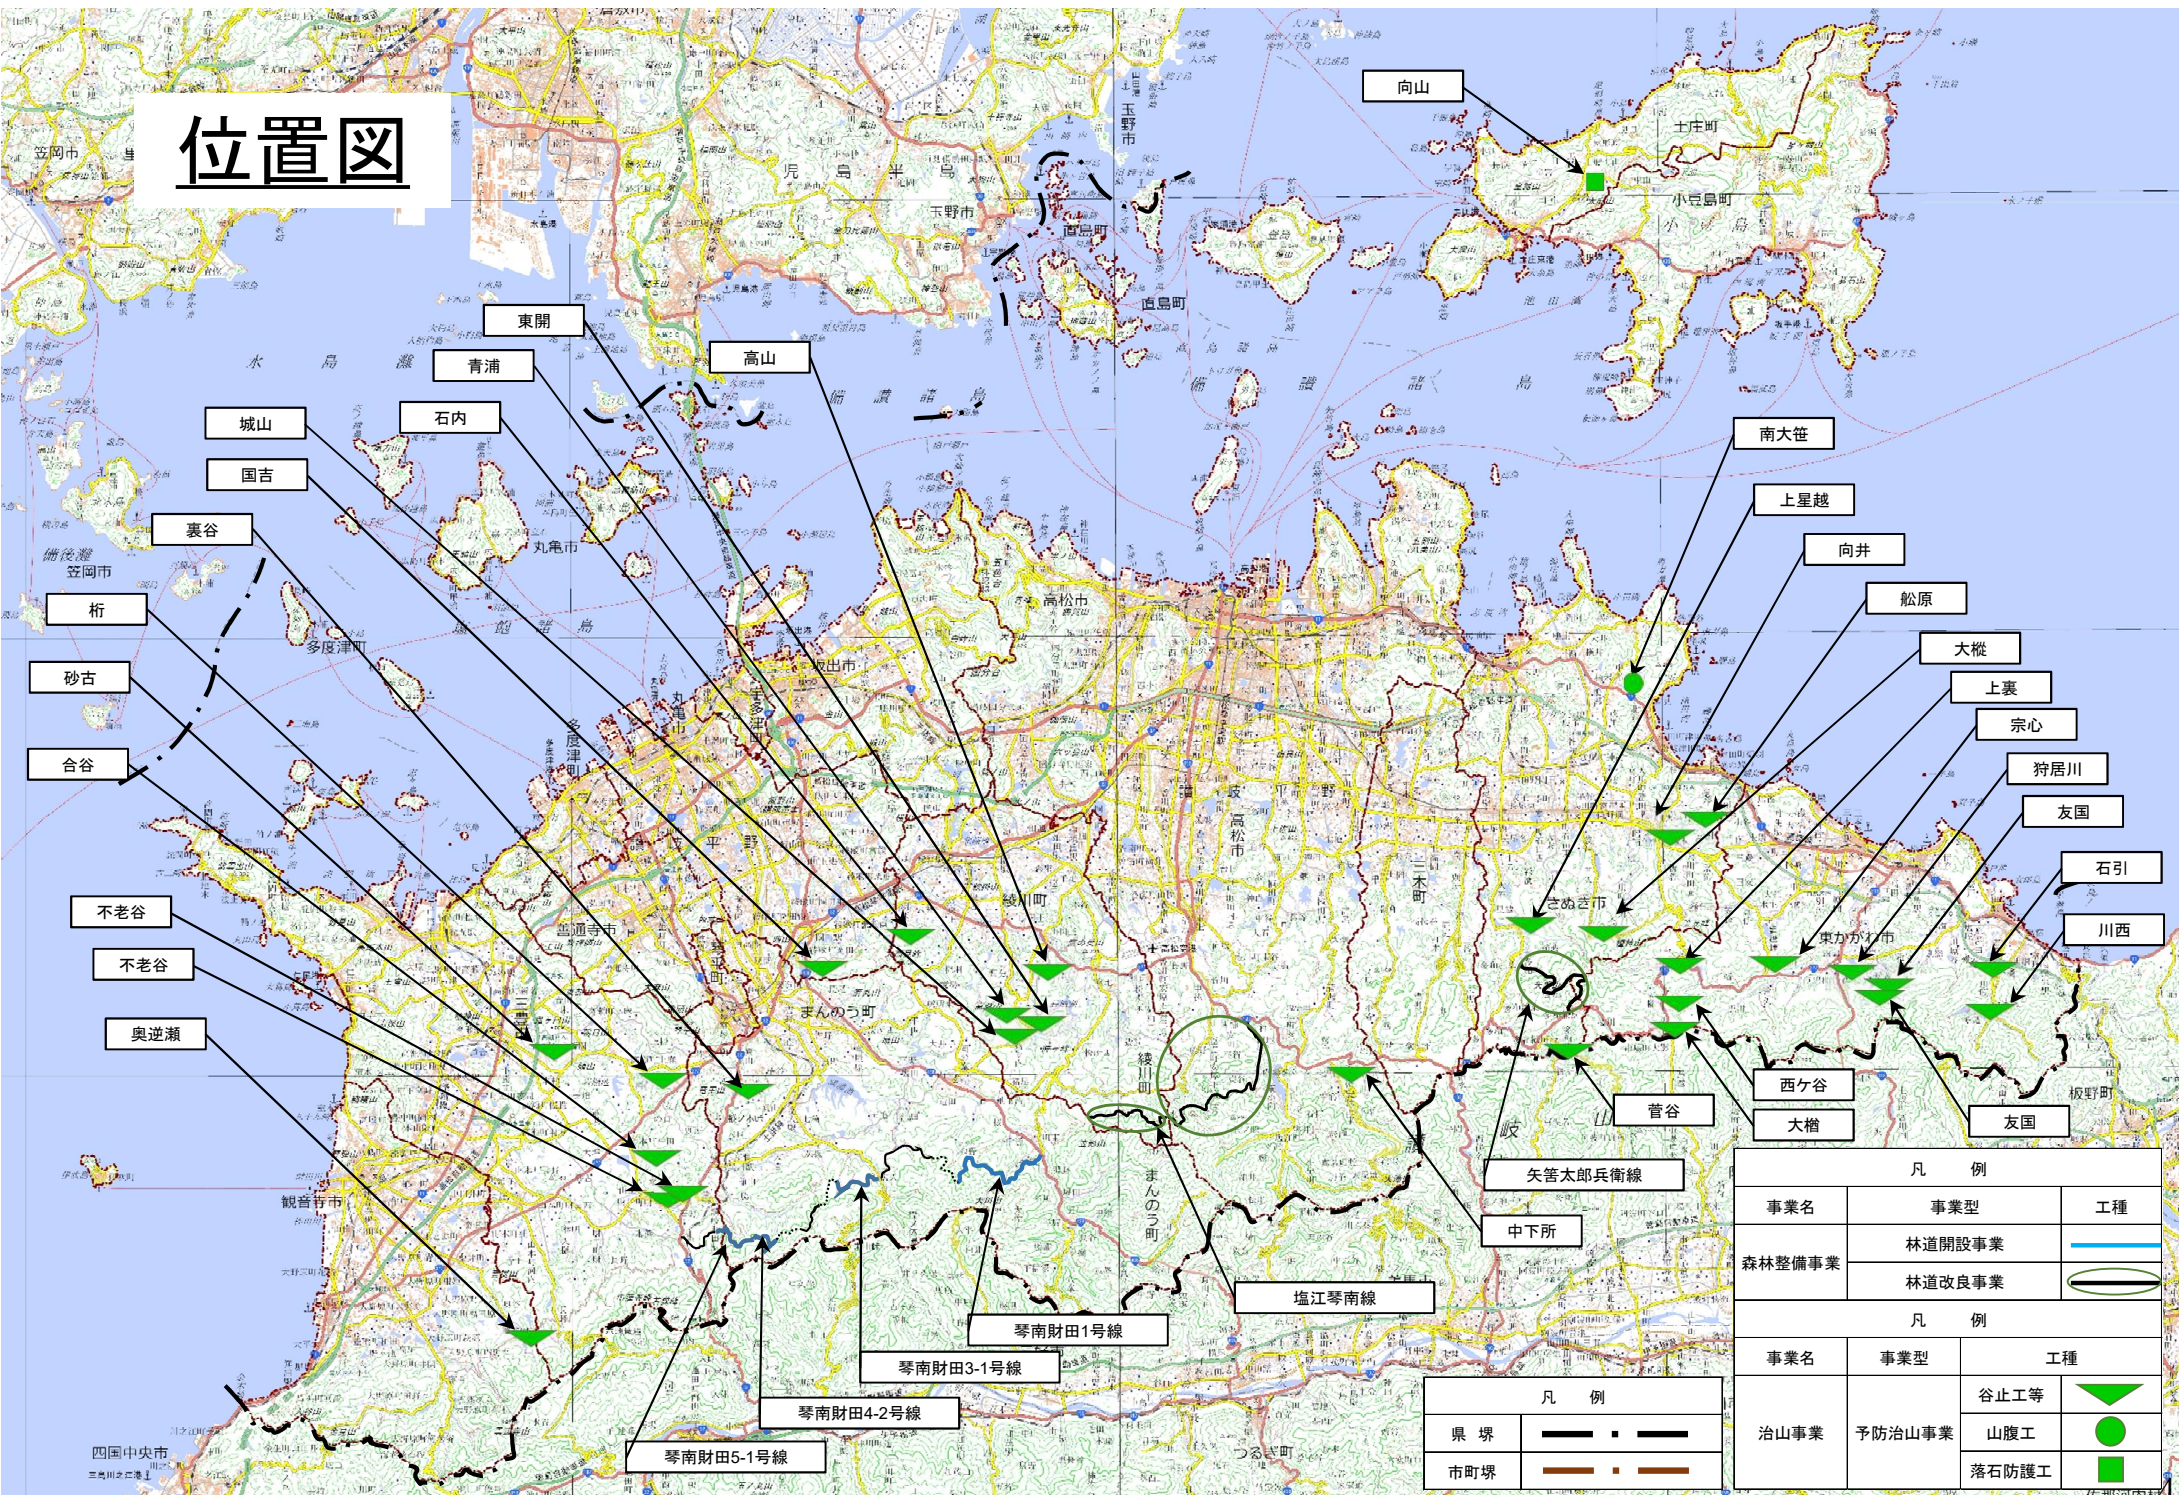

- 東開
- 青浦
- 高山
- 城山
- 石内
- 国吉
- 裏谷
- 丸亀市
- 杉
- 砂古
- 合谷
- 不老谷
- 不老谷
- 奥逆瀬
- 南大笹
- 上星越
- 向井
- 船原
- 大樫
- 上裏
- 宗心
- 狩居川
- 友国
- 石引
- 川西
- 菅谷
- 西ヶ谷
- 大樽
- 友国
- 中下所
- 矢管太郎兵衛線
- 塩江琴南線
- 琴南財田1号線
- 琴南財田3-1号線
- 琴南財田4-2号線
- 琴南財田5-1号線

凡 例		
事業名	事業型	工種
森林整備事業	林道開設事業	
	林道改良事業	

凡 例			
事業名	事業型	工種	
治山事業	予防治山事業	谷止工等	
		山腹工	
		落石防護工	

凡 例	
県 堺	
市町堺	

事業概要

【治山事業】

●谷止工等（28箇所）



●山腹工（1箇所）



●落石防護工（1箇所）



【森林整備事業】

●林道開設（4路線）



●林道改良（3路線）



●点検診断・保全整備（91箇所）

