

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

坂出市における防災・減災対策の推進  
(防災・安全)



社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	1 坂出市における防災・減殺対策の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）	交付対象	坂出市
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている地域における津波等による背後地の浸水面積の低減</li> </ul>		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

- ・護岸の改良工事を行うことで、南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている津波等による背後地の浸水面積の低減について進捗が図れた。
- ・長寿命化計画を作成することで海岸保全施設の適切な維持管理ができるようになった。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南海トラフ巨大地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の整備率の向上</li> </ul>
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考						
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R02末)								
海岸堤防等の整備率の向上 (海岸堤防等の整備率) = (地震津波における整備により防護が完了した面積) / (整備地区における前防護面積)		目標値: 0 %	50 %	100 %	100.0%							
		達成値: 0 %	43 %	100 %								
全体事業費	合計 (A+B+C)	350百万円	A	350百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	100.0%
実施事業費	合計 (A+B+C)	350百万円	A	350百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																	
A 1 海岸事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	H31	R02				
A09-001	海岸	一般	坂出市	直接	坂出市	坂出地区海岸津波等対策整備事業	護岸等 782m	坂出市						332	332	100.0%	
A09-002	海岸	一般	坂出市	直接	坂出市	坂出港海岸 長寿命化計画作成	長寿命化計画作成	坂出市						13	13	100.0%	
A09-003	海岸	一般	坂出市	直接	坂出市	与島港海岸 長寿命化計画作成	長寿命化計画作成	坂出市						5	5	100.0%	
小計(海岸事業)												350	350	100.0%			

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H22	H23	H24	H25	H26				
合計																		

番号	一体的に実施することにより期待される効果			備考
----	----------------------	--	--	----

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H22	H23	H24	H25	H26				
合計												0	0	#DIV/0!				

番号	一体的に実施することにより期待される効果			備考
----	----------------------	--	--	----

その他関連する事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H22	H23	H24	H25	H26				
A'	合計												0	0	#DIV/0!		

要素事業の事業進捗  
計画通り進捗

2. 今後の方針  
継続  

- ・地震津波等対策を引き続き実施し、浸水面積の低減を図る。


## 事後評価書参考資料

### ■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

# 坂出市における防災・減災対策の推進 (防災・安全)

坂出市 建設経済部 みなと課

# 位置図

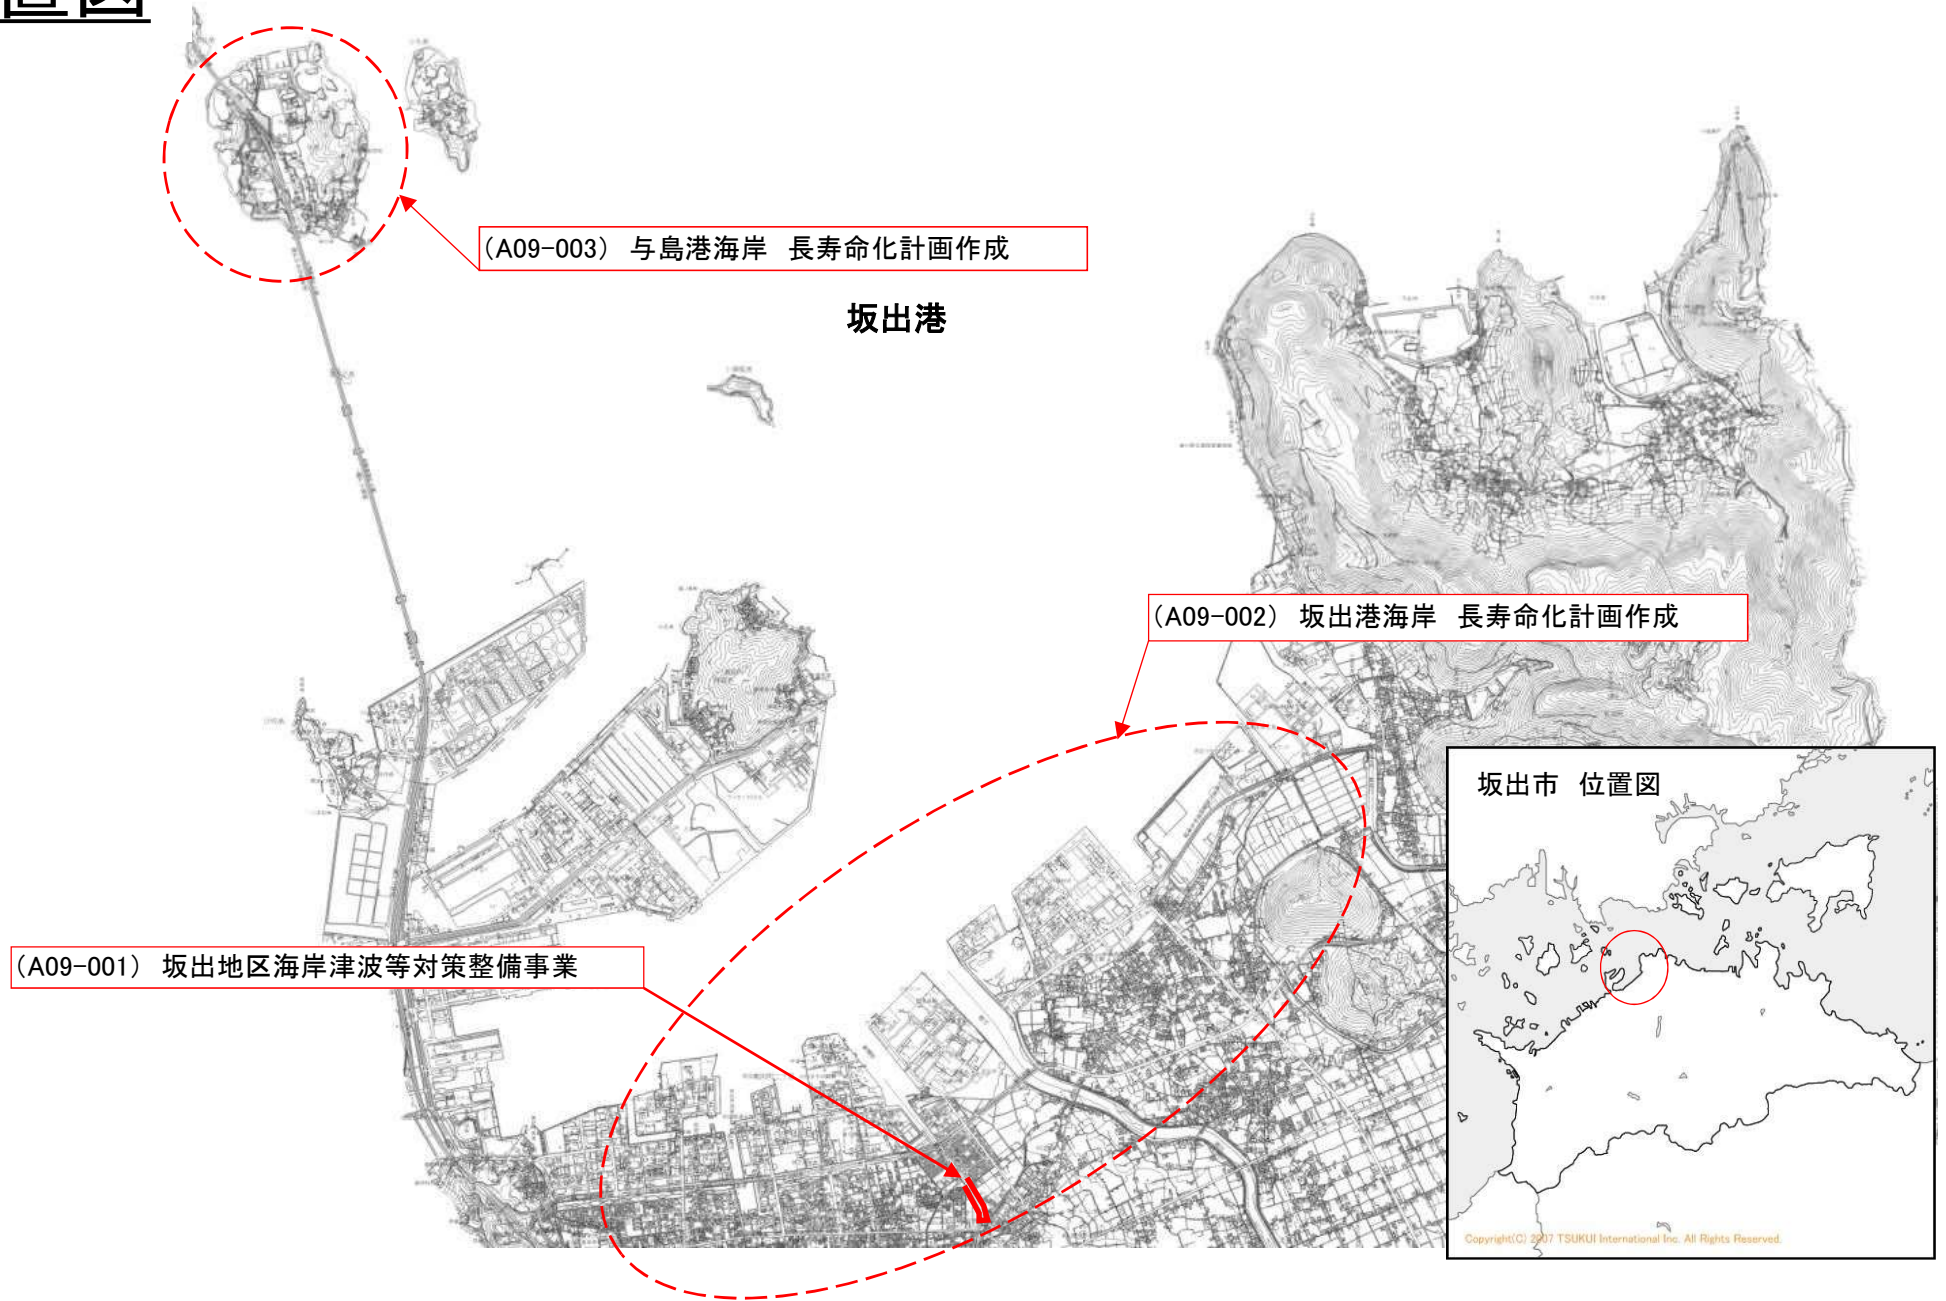

# 事業概要

## ◇香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画


- ・南海トラフを震源とする地震の被害想定を踏まえた海岸堤防や河川堤防等の地震・津波対策として、平成27年3月に「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」（Ⅰ期（前期）計画の実績を踏まえて令和2年3月見直し）を策定した。
- ・施設の状態および背後地の状況などにより、整備の優先度を決定し、整備時期については、概ね10年間を整備目標とするⅠ期とその後概ね10～30年を整備目標とするⅡ・Ⅲ期に分けて設定した。このうち、地震直後に堤防等が沈下し、甚大な被害が想定されるなど特に優先度の高い箇所は、Ⅰ期計画として、平成27年度～令和6年度の10年間で整備することとした。
- ・Ⅰ期（前期）計画（平成27年度～令和元年度）については、ほぼ計画通りの進捗となっており、現在はⅠ期（後期）計画（令和2年度～令和6年度）の5年間で整備する箇所について、順次事業を進めている。

事業区分	全体計画		Ⅰ期計 <sup>1</sup> 画						Ⅱ・Ⅲ期計画	
			Ⅰ期（前期）実績 H27～R1		Ⅰ期（後期）計画 R2～R6		Ⅰ期計画（合計） H27～R6			
	整備 延長 （km）	概算 事業費 （億円）	整備 延長 （km）	実施 事業費 （億円）	整備 延長 （km）	概算 事業費 （億円）	整備 延長 （km）	概算 事業費 （億円）	整備 延長 （km）	概算 事業費 （億円）
県管理海岸堤防	70	189	14	48	14	59	29	107	41	82
市町管理海岸堤防	53	186	2	6	5	9	7	15	46	171
県管理河川堤防	53	304	10	42	7	42	17	84	36	220
合計	176	679	26	96	27	110	53	206	123	473

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。



# 事業概要

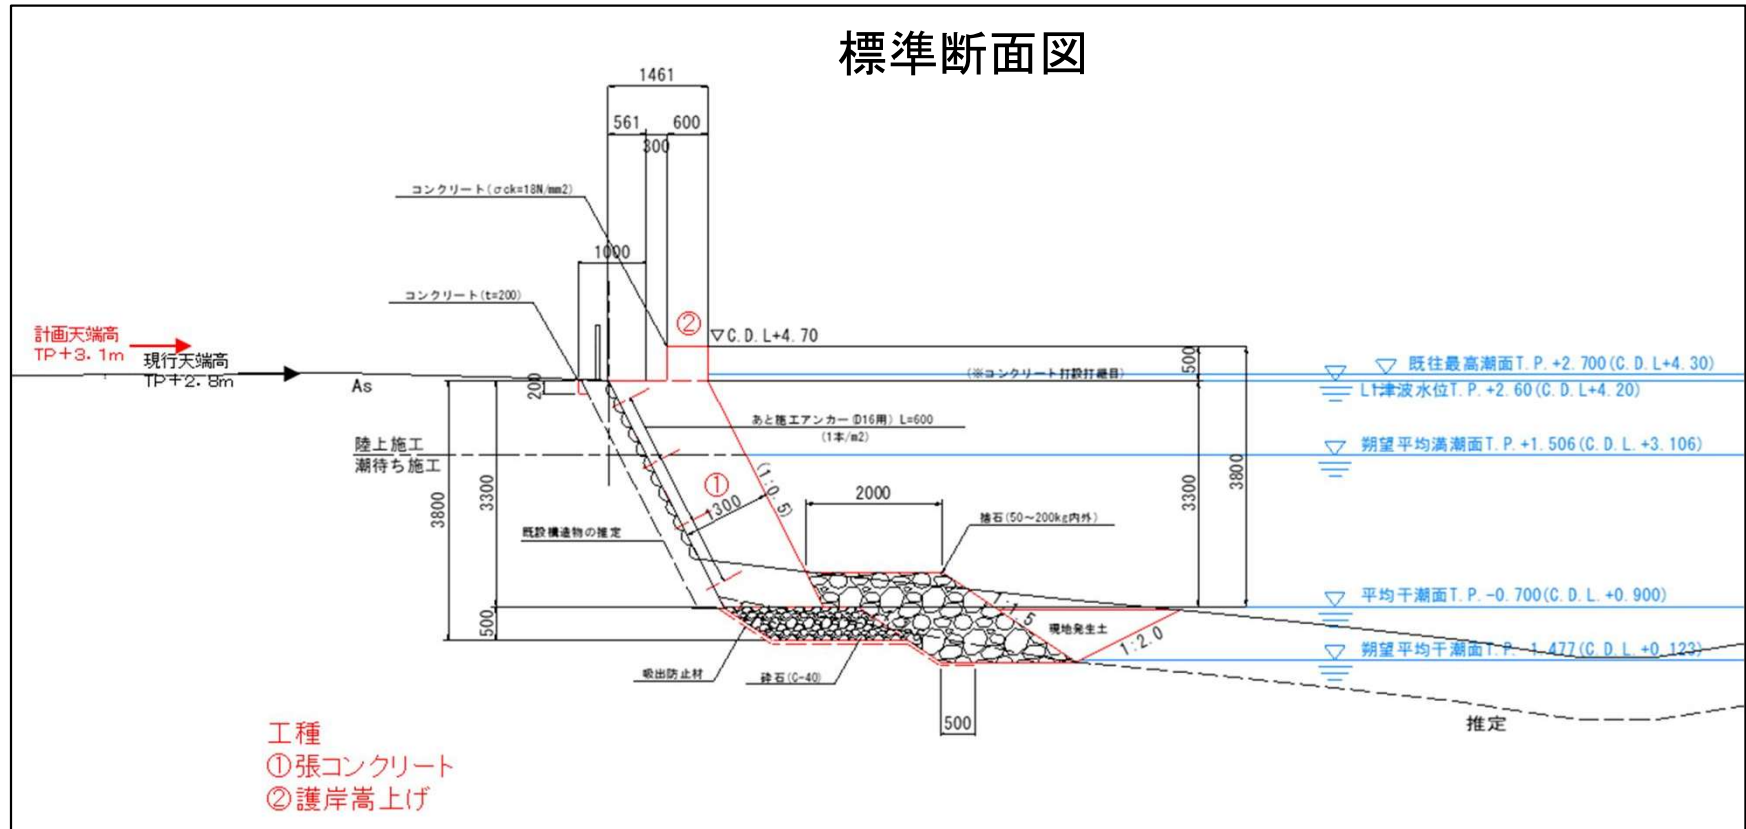

整備後

