


# 再 評 価 対 象 事 業

農山漁村地域整備交付金  
農村集落基盤再編・整備事業  
(中山間地域総合整備事業)


## 土庄西部地区

農政水産部 農村整備課

とらはましんが い  
**農業集落道整備 B-1 虎浜新開 事業概要・進捗状況 ①**

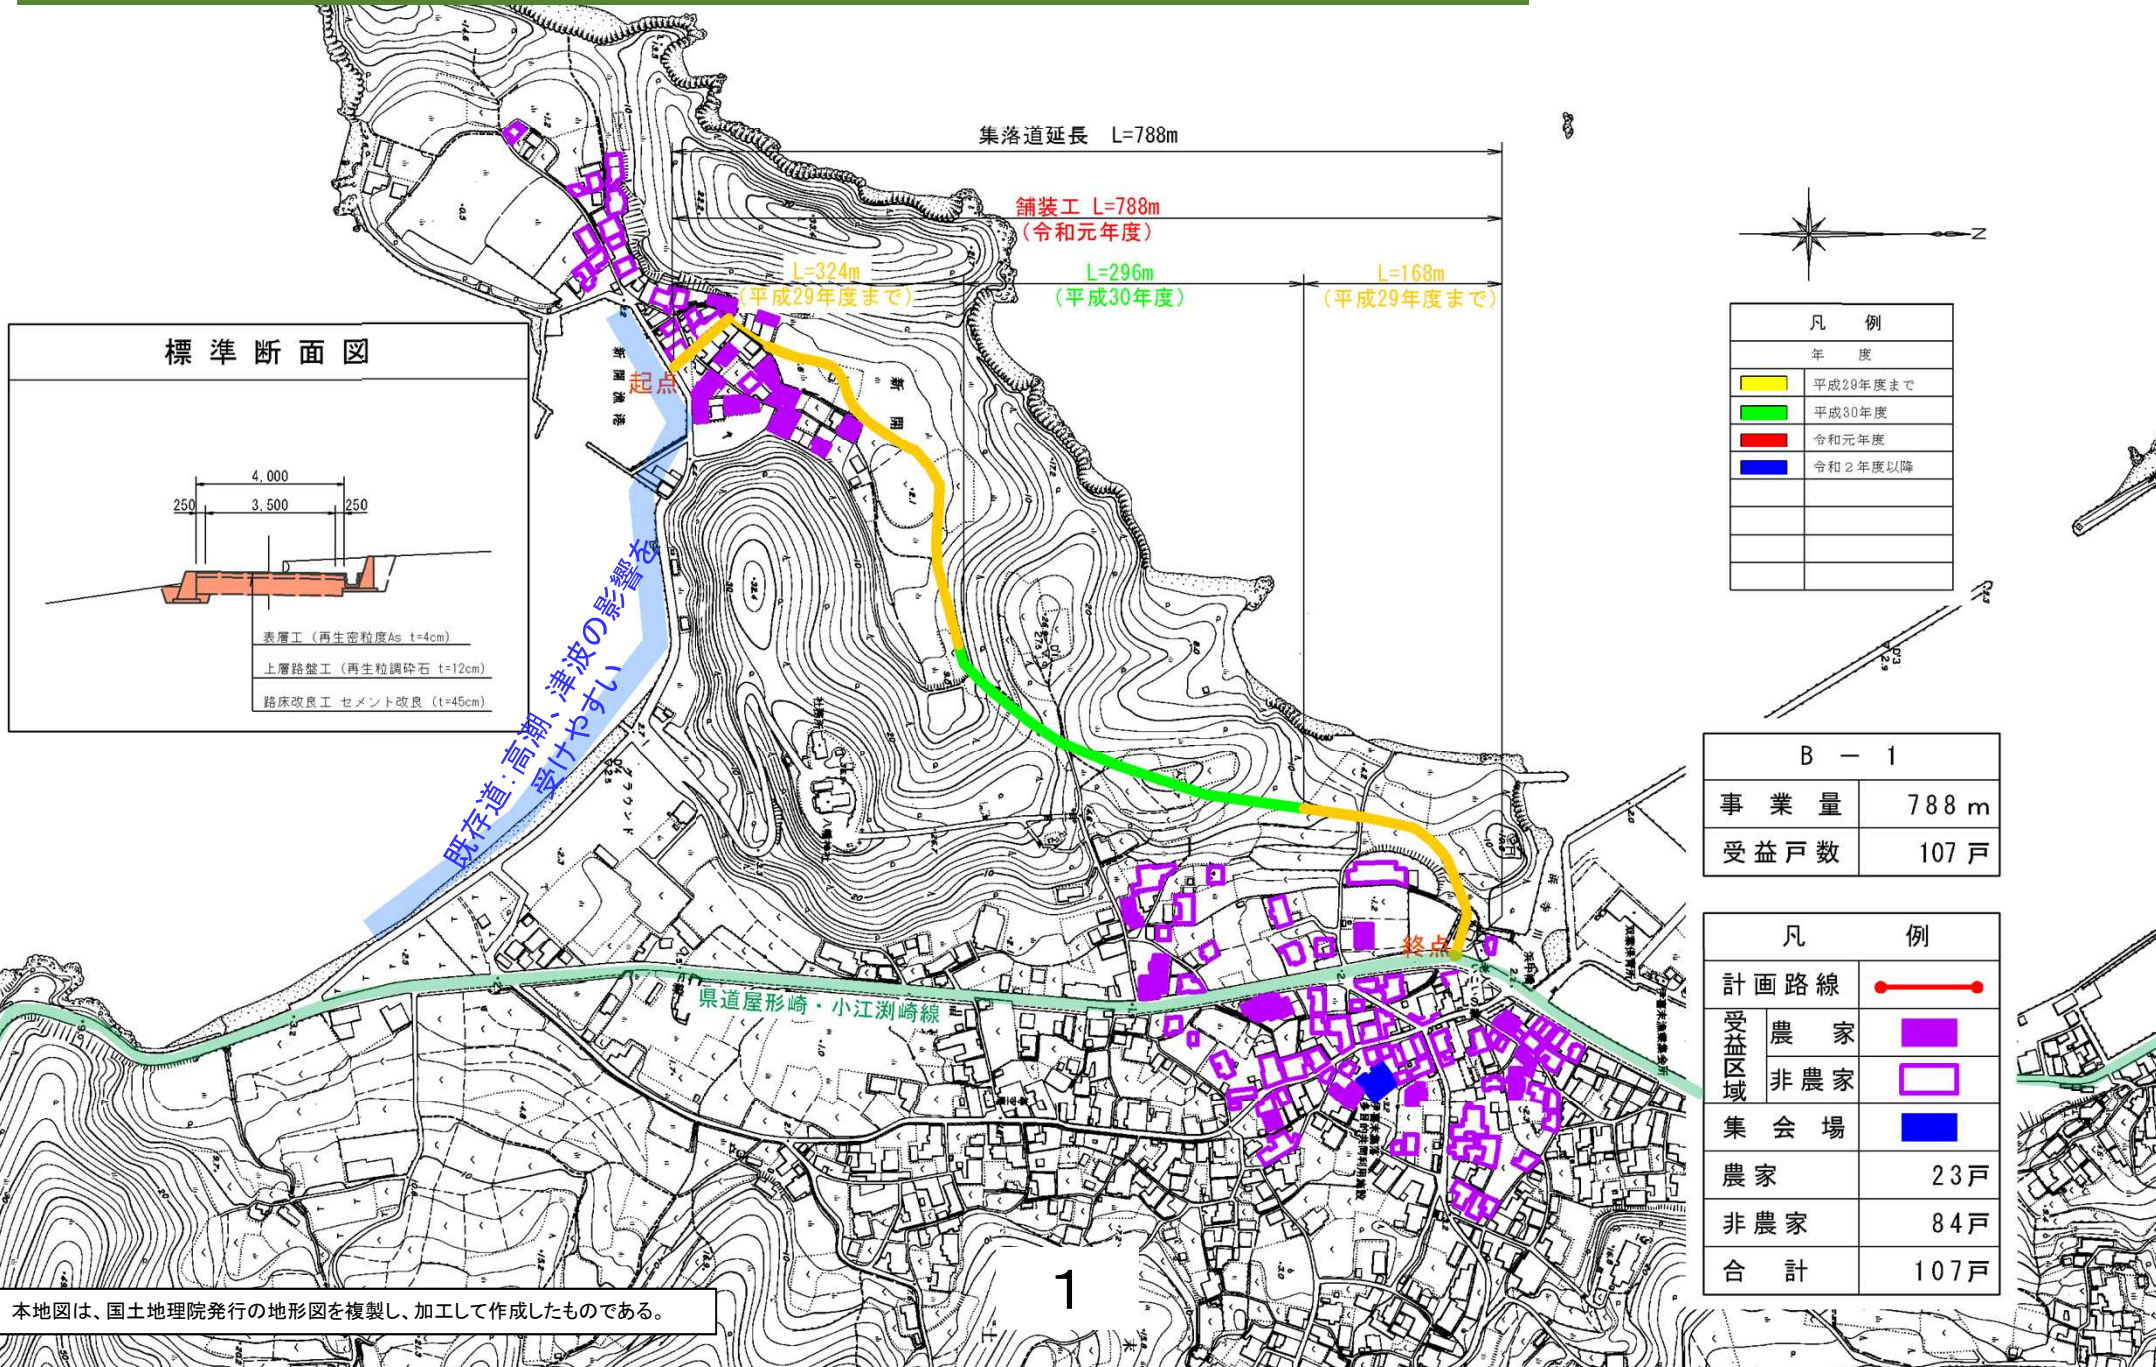

標準断面図



集落道延長 L=788m

舗装工 L=788m  
 (令和元年度)


L=324m  
 (平成29年度まで)

L=296m  
 (平成30年度)

L=168m  
 (平成29年度まで)

既存道:高潮、津波の影響を受けやすい

県道屋形崎・小江洲崎線



凡 例	
年 度	
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成29年度まで
<span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成30年度
<span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	令和元年度
<span style="background-color: blue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	令和2年度以降

B - 1	
事業量	788 m
受益戸数	107 戸

凡 例	
計画路線	<span style="color: red; font-weight: bold;">—</span>
受益区域	農 家 <span style="background-color: purple; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
	非農家 <span style="border: 1px solid purple; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
集会場	<span style="background-color: blue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
農家	23 戸
非農家	84 戸
合計	107 戸

本地図は、国土地理院発行の地形図を複製し、加工して作成したものである。






頭首工

# 農業用排水施設整備 A-9 いちのいで 一ノ井出 事業概要・進捗状況 ①

離宮八幡神社

肥土山  
農村歌舞伎舞台

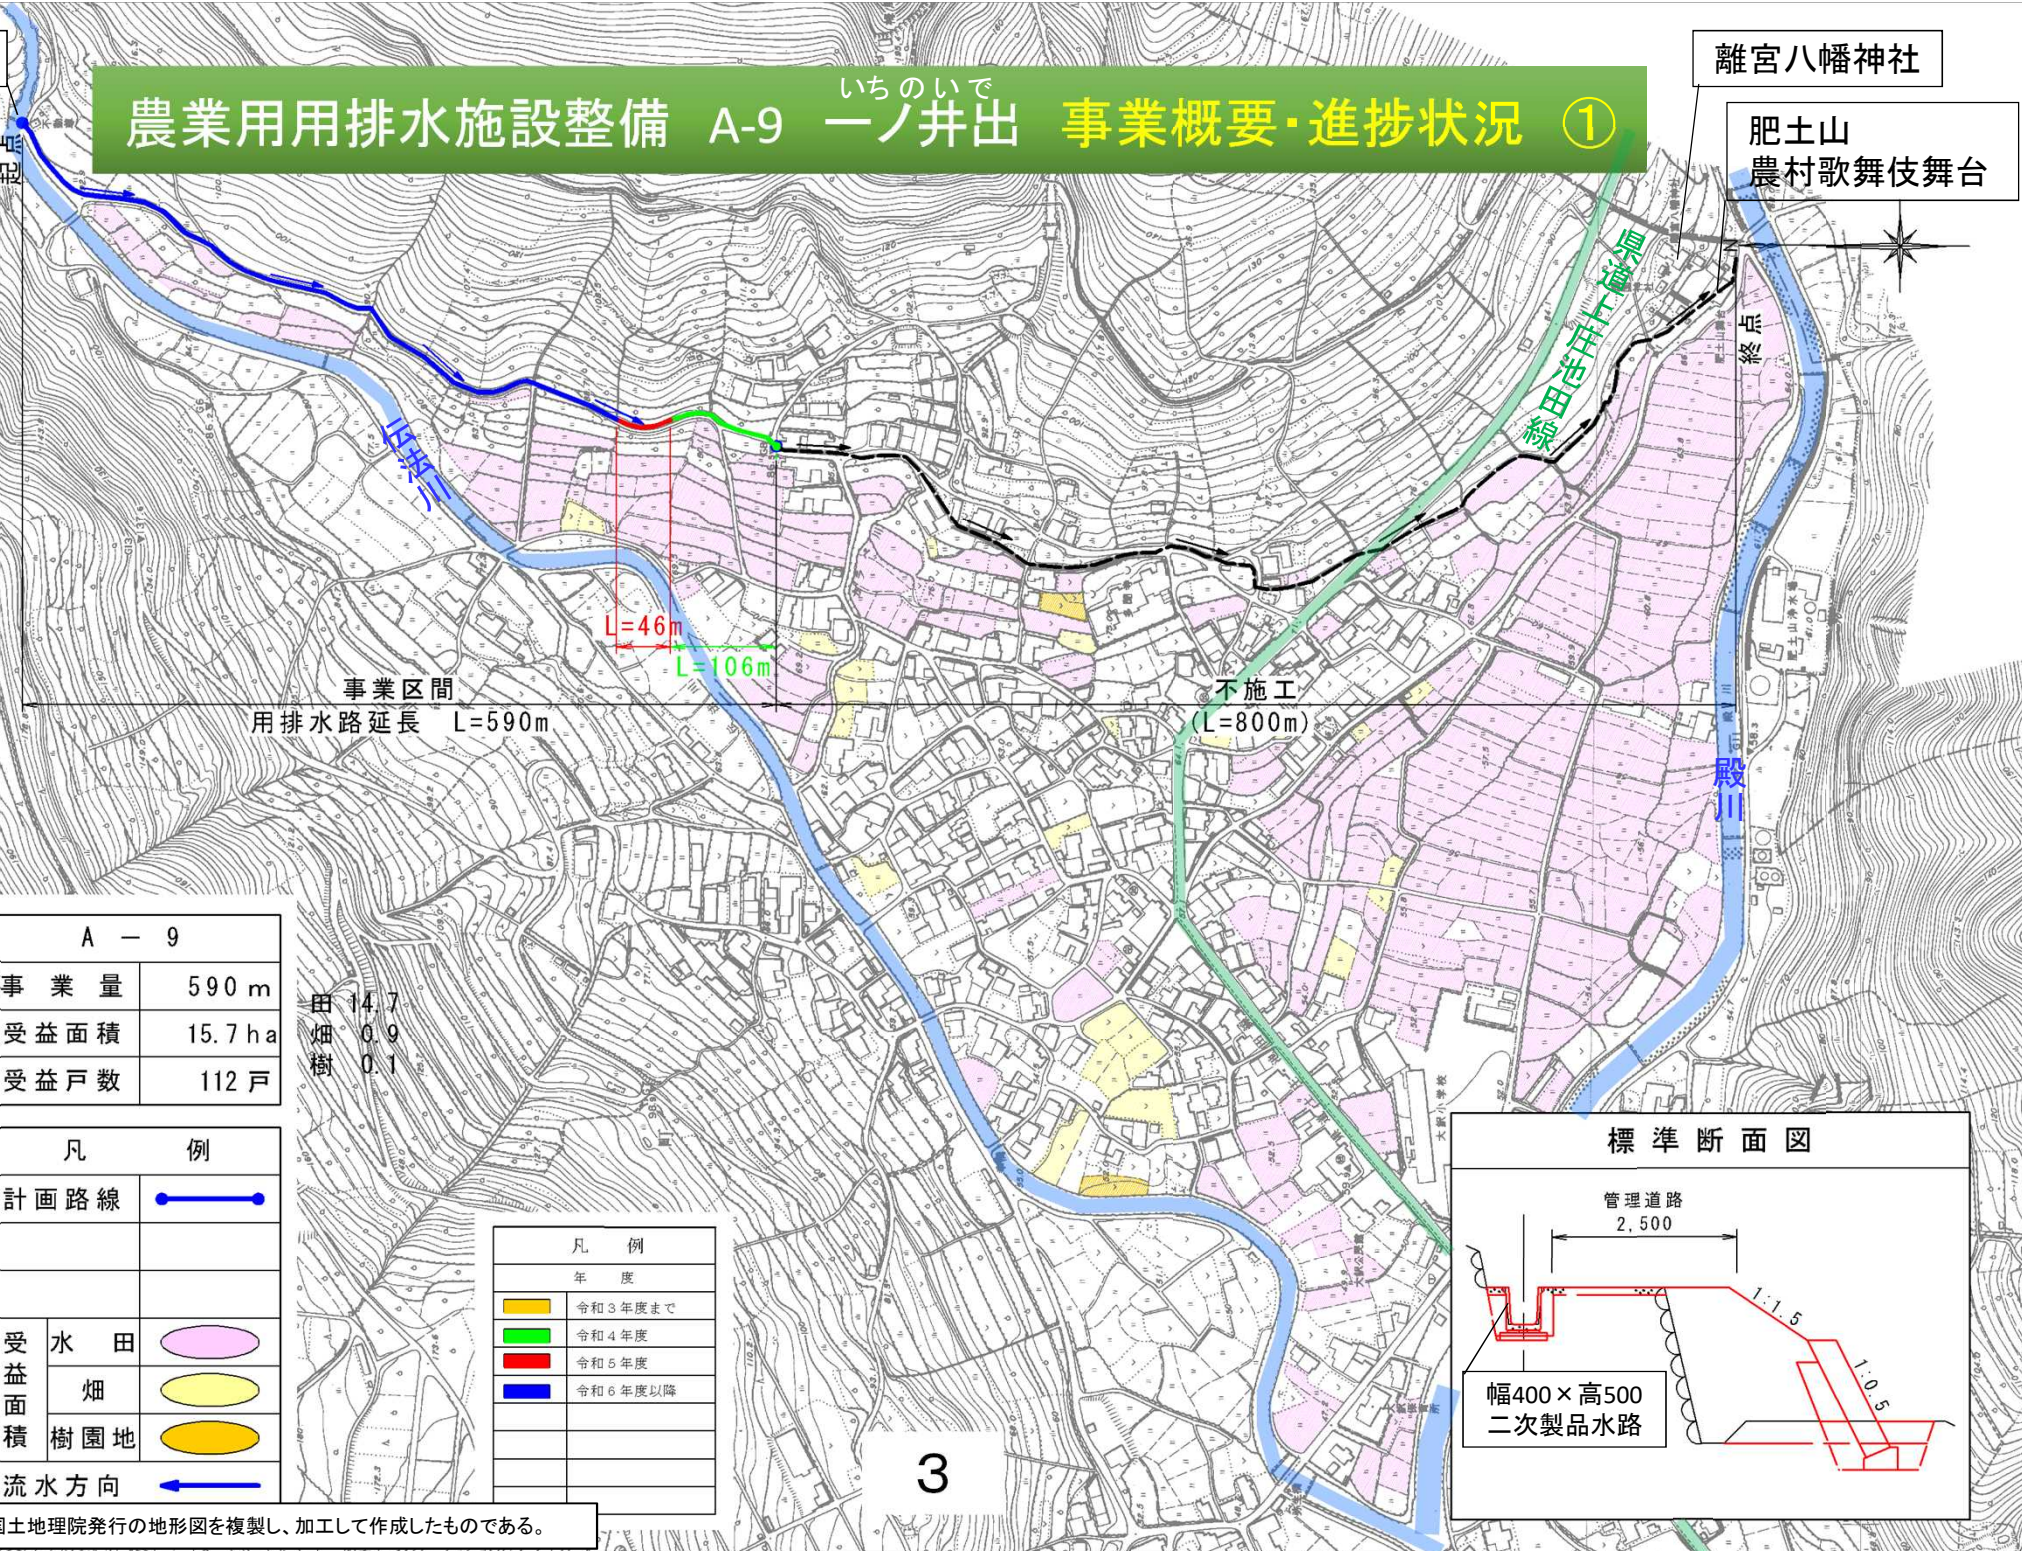

事業区間  
用排水路延長 L=590m

不施工  
(L=800m)


L=46m  
L=106m

A - 9	
事業量	590 m
受益面積	15.7 ha
受益戸数	112 戸

田 14.7  
畑 0.9  
樹園地 0.1

凡 例	
計画路線	
受益面積	
水田	
畑	
樹園地	
流水方向	

凡 例	
年 度	
	令和3年度まで
	令和4年度
	令和5年度
	令和6年度以降

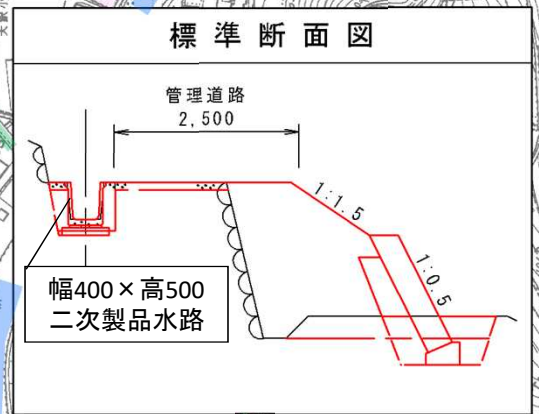

3

本地図は、国土地理院発行の地形図を複製し、加工して作成したものである。



○進捗状況

事業費の単位：千円

	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)	令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績)	令和5年度 (見込)	令和6年度 (予定)	令和7年度以降 (予定)	計	備考
事業費	7,269	5,092	7,280	15,965	15,000	23,000	48,679	122,285	
測量設計	←————→								完了済
用地買収			←————→						完了済
工事				106m	46m	140m	298m	590m	令和8年度完了予定

○事業効果

- ・食料安定供給効果
- ・営農経費の節減
- ・維持管理費の節減  
(軽トラでの維持管理が可能に)
- ・耕作放棄地の減少
- ・伝統文化の保全・継承(虫送り)

○コスト縮減

- ・二次製品水路の採用
- ・他事業発生土の利用
- ・工事用道路を有効活用し、管理用道路とする計画

