

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

生活に密着した道路整備による快適なくらしづくり

計画の名称	生活に密着した道路整備による快適な暮らしづくり（社会資本整備総合交付金）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	香川県、高松市、三木町、多度津町、坂出市
計画の目標	香川県内の地域生活を支援する生活道路の整備を行い、円滑で安全な通行空間を確保し、生活環境の向上を図る。		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

事業の実施により、線形不良・狭隘部・道路混雑等箇所が3.5km整備され、安全な通行を確保し、一定の効果を確認した。

計画の成果目標（定量的指標）

各事業箇所において、線形不良、狭隘箇所、道路混雑等の道路整備を行い、利用者が安全に通行できる道路の整備率の向上

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値						達成率	備考				
	当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)									
安全な通行を確保した道路の整備率 (利用者が安全に通行できる道路の整備延長) / (利用者が安全に通行できる計画道路の未整備延長)	0%	33%	42%	目標値: 達成値:			74%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,993百万円	A	2,993百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	67%
実施事業費	合計 (A+B+C)	2,013百万円	A	2,013百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					
1-A1-1	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 丸亀三好線(久保)	バイパス 0.8km	まんのう町						200	111	56%	用地買収の難航	
1-A1-2	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 志度山川線(前山・多和)	バイパス 1.4km	さぬき市						800	610	76%	用地買収の難航	
1-A1-3	道路	一般	高松市	直接	高松市	(1) 香西郷東線	バイパス 0.38km	高松市						11	5	45%	用地買収の難航	
1-A1-4	道路	一般	高松市	直接	高松市	(他) 下川原北線	バイパス 0.46km	高松市						187	140	75%	他事業を優先的に整備	
1-A1-5	道路	一般	高松市	直接	高松市	(他) 城渡吉光線	バイパス 0.67km	高松市						166	166	100%	完了	
1-A1-6	道路	一般	高松市	直接	高松市	(他) 御殿1号線	道路改良 0.02km	高松市						8	0	0%	他計画での実施により完了	
1-A1-7	道路	一般	三木町	直接	三木町	(他) 三木志度線	バイパス 0.62km	三木町						363	16	4%	予算が確保できなかった	
1-A1-8	道路	一般	三木町	直接	三木町	(2) 正一駒足線	現道拡幅 0.06km	三木町						16	16	100%	完了	
1-A1-9	道路	一般	多度津町	直接	多度津町	(他) 川西阿庄線	バイパス 0.6km	多度津町						17	17	100%	完了	
1-A1-10	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 志度山川線(大多和)	現道拡幅 1km	さぬき市						200	5	3%	他事業を優先的に整備	
1-A1-11	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 小養前田東線(虹の滝)	道路改良 0.9km	三木町						522	492	94%	予算が確保できなかった	
1-A1-12	道路	一般	坂出市	直接	坂出市	(他) 聖通寺登山道(常盤)	道路改良 0.28km	坂出市						300	291	97%	事業費見直しによる、完了	
1-A1-13	道路	一般	高松市	直接	高松市	(1) 御殿成合線	道路改良 0.54km	高松市						113	105	93%	事業費見直しによる、完了	
1-A1-14	道路	一般	高松市	直接	高松市	(他) 香西5号線	バイパス 0.22km	高松市						11	11	100%	計画通り進捗	
1-A1-15	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 377号(五名)	バイパス 3.2km	東かがわ市						79	28	35%	予算が確保できなかった	
合計											2,993	2,013	67%					

B 関連社会資本整備事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					

C 効果促進事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					

その他関連する事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6					
													0	0				

要素事業の事業進捗

概ね計画通り進捗

- 6つの要素事業について計画通り進捗して完了した。
- 用地買収難航等の理由により、進捗率が上がらない要素事業もあるが、予算配分が限られる中で効率的に事業が進捗できるよう優先配分等の工夫を行い進捗に努めた。

2. 今後の方針

継続

- 引き続き、地域生活を支援する生活道路の整備を行い、円滑で安全な通行空間の確保を行っていく。
- 事業の完了時期や整備効果等により優先順位を精査し、効率的かつ計画的に事業を進める。

事後評価書参考資料


■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

生活に密着した道路整備による快適なくらしづくり

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 生活に密着した道路整備による快適な暮らしづくり
 計画の期間 令和2年度～令和6年度（5年間）
 交付団体 香川県、高松市、三木町、多度津町、坂出市

事業箇所図

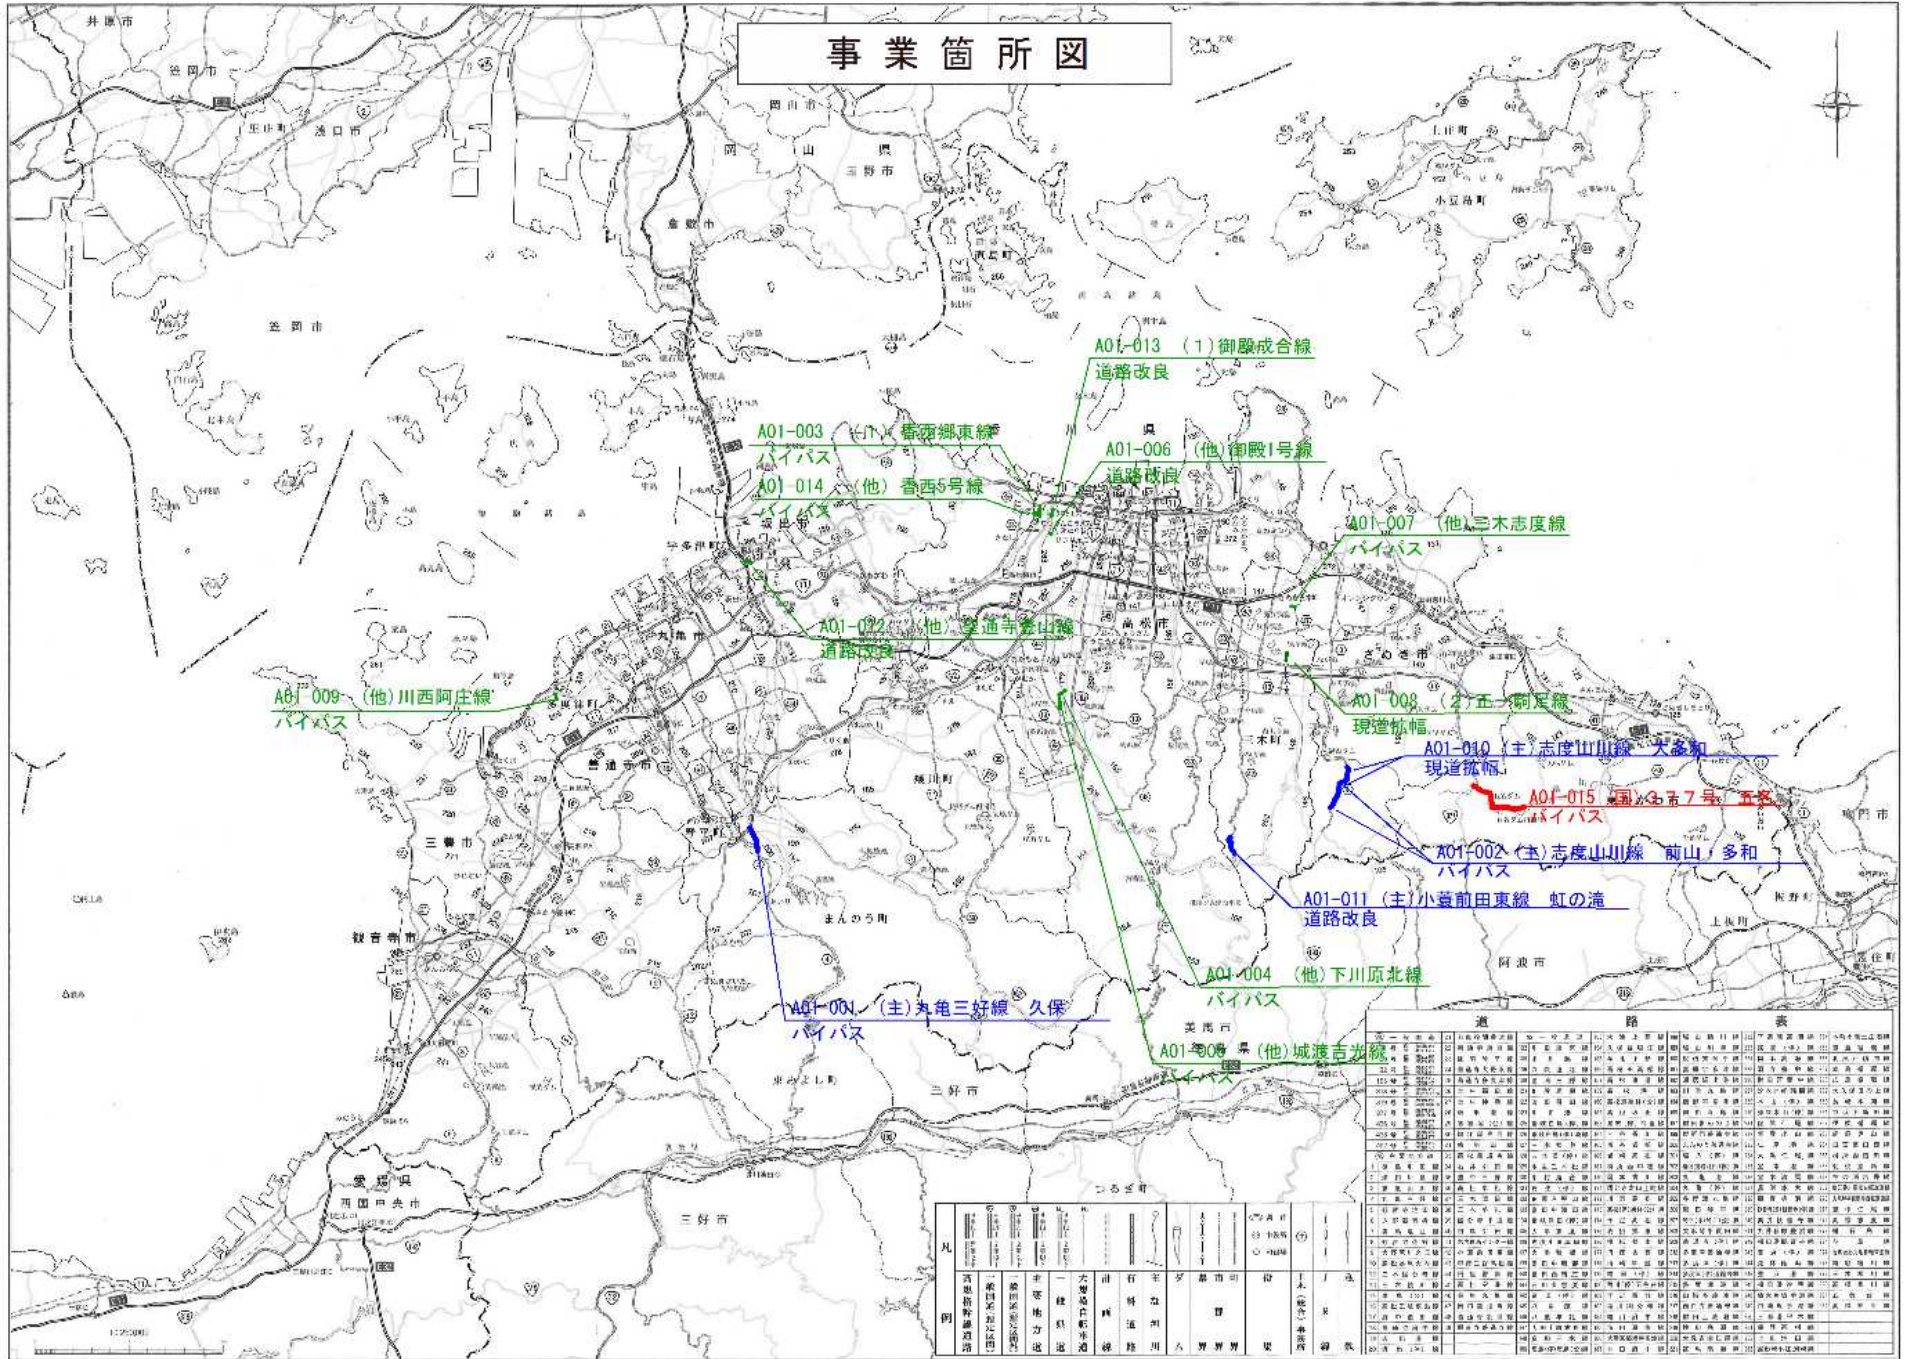

赤色線 国道
 青色線 県道
 緑色線 市町道

凡	項目	内容	備考
1	路線	香西郷東線	バイパス
2	路線	香西5号線	バイパス
3	路線	御駈成合線	道路改良
4	路線	御駈1号線	道路改良
5	路線	三木志度線	バイパス
6	路線	空通寺金山線	道路改良
7	路線	川西阿庄線	バイパス
8	路線	五ノ町尾線	現道拡幅
9	路線	志度山山線	大森和 現道拡幅
10	路線	志度山山線	大森和 バイパス
11	路線	志度山山線	前山、多和 バイパス
12	路線	小菟前田東線	虹の滝 道路改良
13	路線	下川原北線	バイパス
14	路線	丸亀三好線	久保 バイパス
15	路線	城渡古沢線	バイパス

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用し作成したものである。（平29四使 第1号）

事業概要

()は実績

事業内容			計画完了後 整備完了数	残数
内容	箇所数	延長		
現道拡幅	6箇所	L=2.8km	4箇所 (4箇所)	2箇所 (2箇所)
バイパス	9箇所	L=8.4km	5箇所 (2箇所)	4箇所 (7箇所)

事業概要

- ① 現道拡幅（県道小蓑前田東線（虹の滝工区））
施工箇所：三木町



- ② バイパス（県道丸亀三好線（久保工区））
施工箇所：まんのう町



事業概要

③ バイパス（市道城渡吉光線）

施工箇所：高松市



着手前




R6時点

未完了箇所図

くらしづくり

交付団体 香川県、高松市、三木町、多度津町、坂出市

事業箇所図

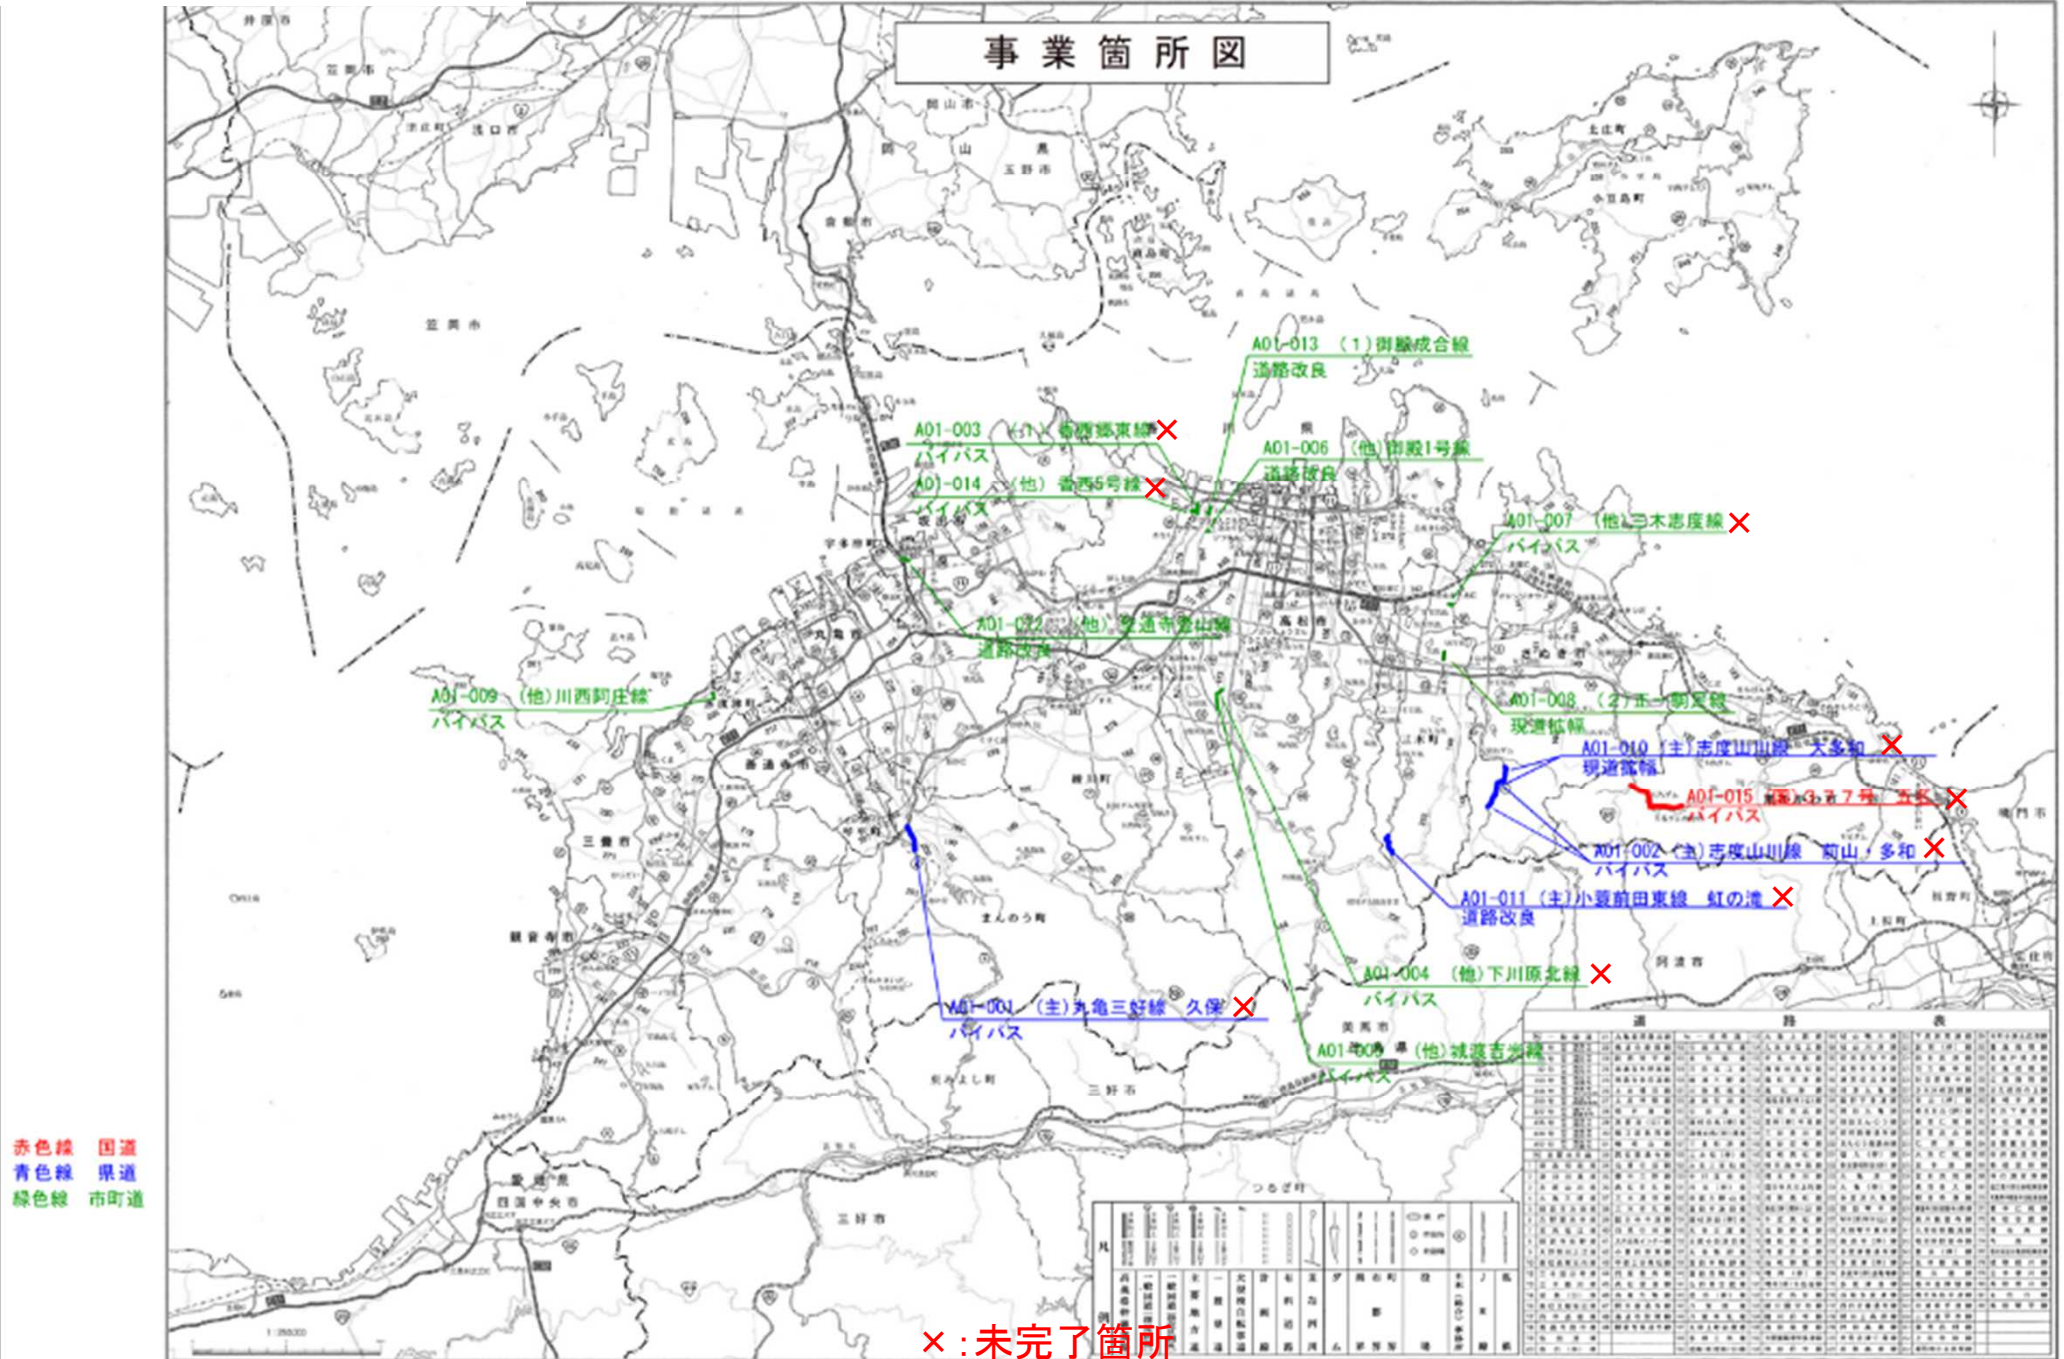

赤色線 国道
 青色線 県道
 緑色線 市町道

×:未完了箇所

事業箇所番号	事業箇所名称	道路種別	延長(km)	事業内容	完了状況	備考
A01-001	(主)丸亀三好線 久保	県道	1.2	バイパス	完了	
A01-002	(主)志度山川線 岡山、多和	県道	2.5	バイパス	完了	
A01-003	(主)香西郡東線	市町道	0.8	バイパス	完了	
A01-004	(他)下川原北線	市町道	0.5	バイパス	完了	
A01-005	(他)城道吉歩線	市町道	0.3	バイパス	完了	
A01-006	(他)御殿1号線	市町道	0.4	道路改良	完了	
A01-007	(他)三木志度線	市町道	0.6	バイパス	完了	
A01-008	(2)正一町交線	市町道	0.2	現道拡幅	完了	
A01-009	(他)川西阿庄線	市町道	0.7	バイパス	完了	
A01-010	(主)志度山川線 大多和	県道	1.8	現道拡幅	完了	
A01-011	(主)小笠前田東線 虹の滝	市町道	0.9	道路改良	完了	
A01-012	(他)香西5号線	市町道	0.5	バイパス	完了	
A01-013	(1)樹籾成合線	市町道	0.4	道路改良	完了	
A01-014	(他)香西5号線	市町道	0.5	バイパス	完了	
A01-015	新築3号線 五長	市町道	0.3	バイパス	完了	

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用し作成したものである。(平23国保 第1号)
