

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

活力ある多度津の港づくり

計画の名称	13 活力ある多度津の港づくり (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (4年間)	交付対象	多度津町
計画の目標	・ 県域部船橋格利用船数の増加による漁業の担い手の確保。		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

・ 船橋格の新設により現在の漁船の大型化に対応できるようになり、島外で補修やメンテナンスをせざるを得なかった漁船が島内で行うことができるようになり、漁業を営める基盤を作ることができた。

計画の成果目標 (定量的指標)	港内における漁船数を調査する。		
-----------------	-----------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値				達成率	備考				
	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
港内の漁船数を調査する。	目標値: 33隻 達成値: 33隻		(R5末) 70隻 53隻		54.1%	・ 現在漁船移動を順次行っているところであるため、現段階では最終目標値に達していません。				
全体事業費	合計 (A+B+C)	200百万円	A	200百万円	B	C	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	100%
実施事業費	合計 (A+B+C)	200百万円	A	200百万円	B	C	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	0.00%		

交付対象事業																	
A 1 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	拠出となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
A02-001	港湾	離島	多度津町	直接	多度津町	船橋格等の改良	船橋格 L=15.0m 泊地(-2.0m) A=250.0㎡	多度津町						200	200	100%	完了
合計														200	200	100%	

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	拠出となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				

C 効果促進事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	拠出となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				

その他関連する事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	拠出となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
合計														0	0		

重要事業の事業進捗
概ね計画通り進捗

2. 今後の方針
完了

事後評価書参考資料

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）


活力ある多度津の港づくり

位置図




出典(背景: 国土地理院、行政区域: 国土数値情報)

位置図

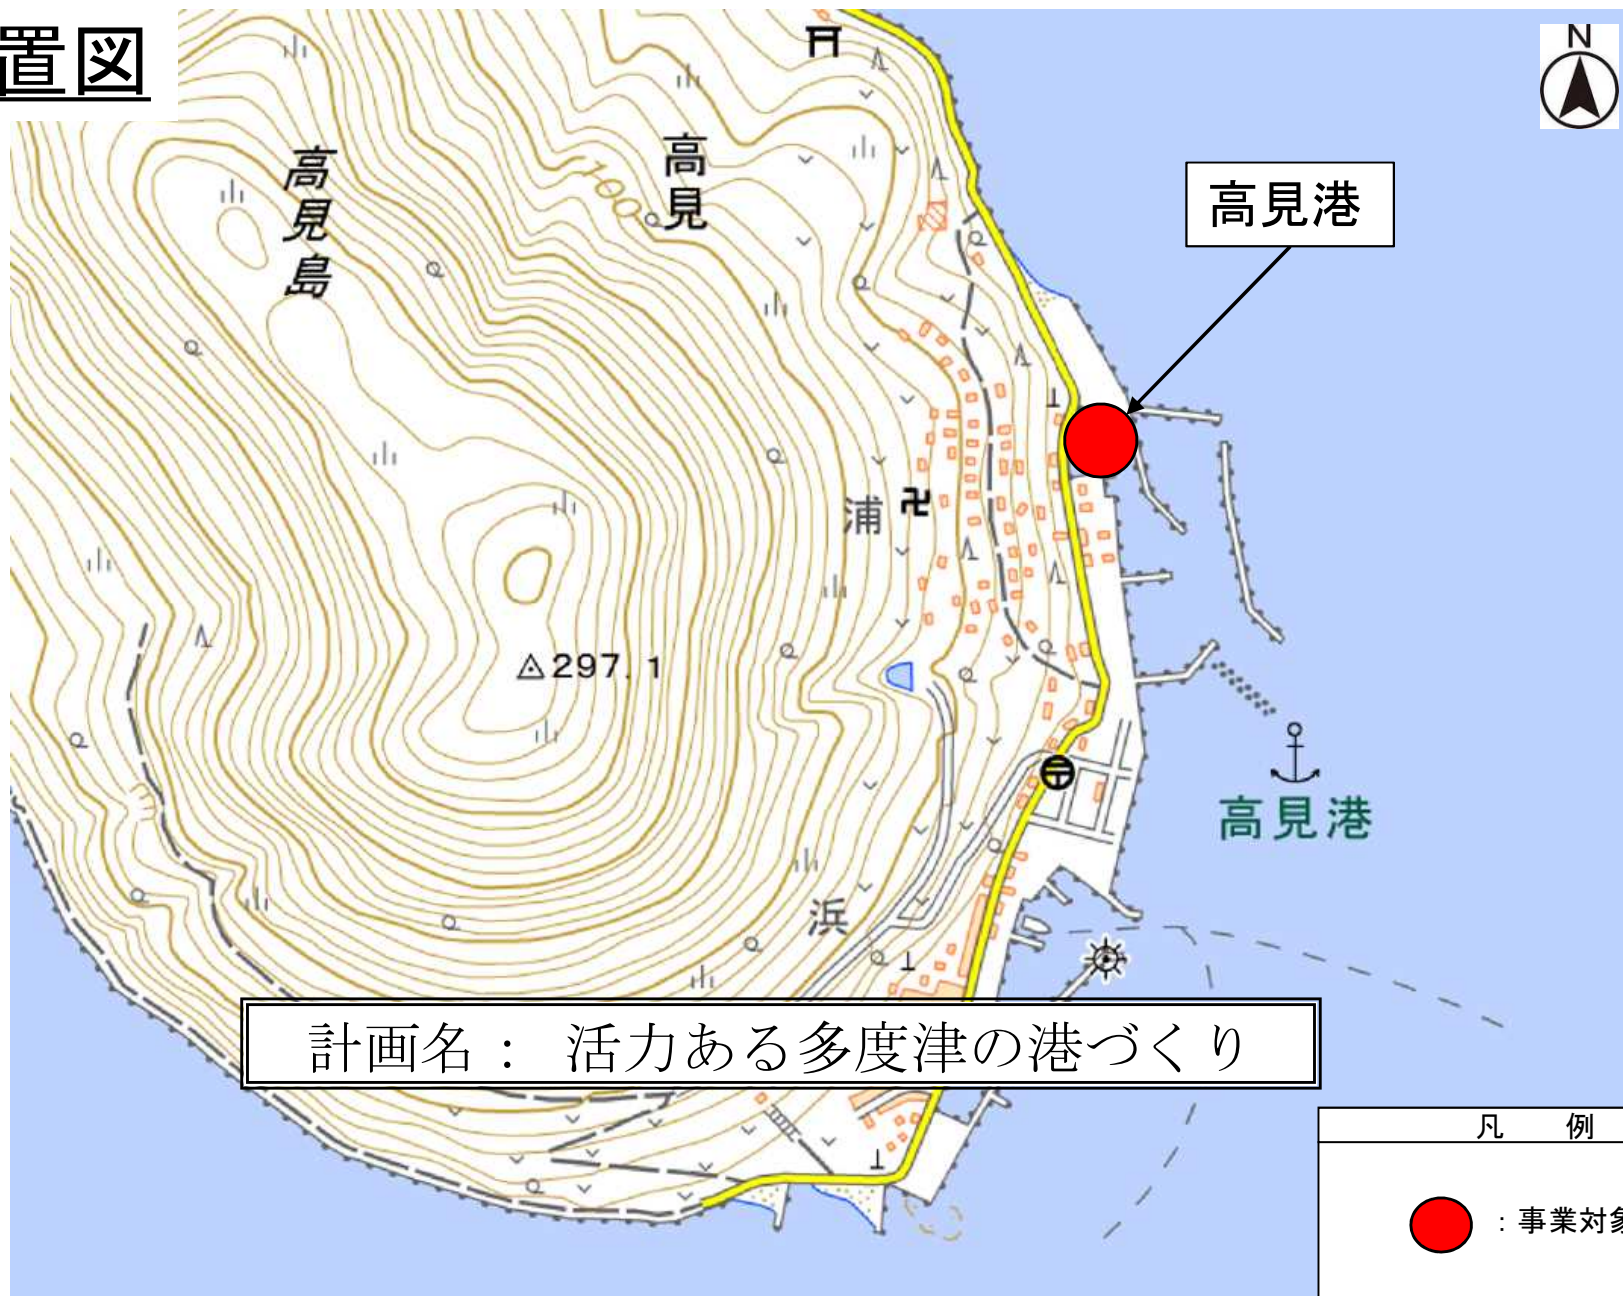

計画名： 活力ある多度津の港づくり


凡 例	
	: 事業対象箇所

出典(背景: 国土地理院)

事業概要

・ 計画平面図

計画平面図 S=1:1000

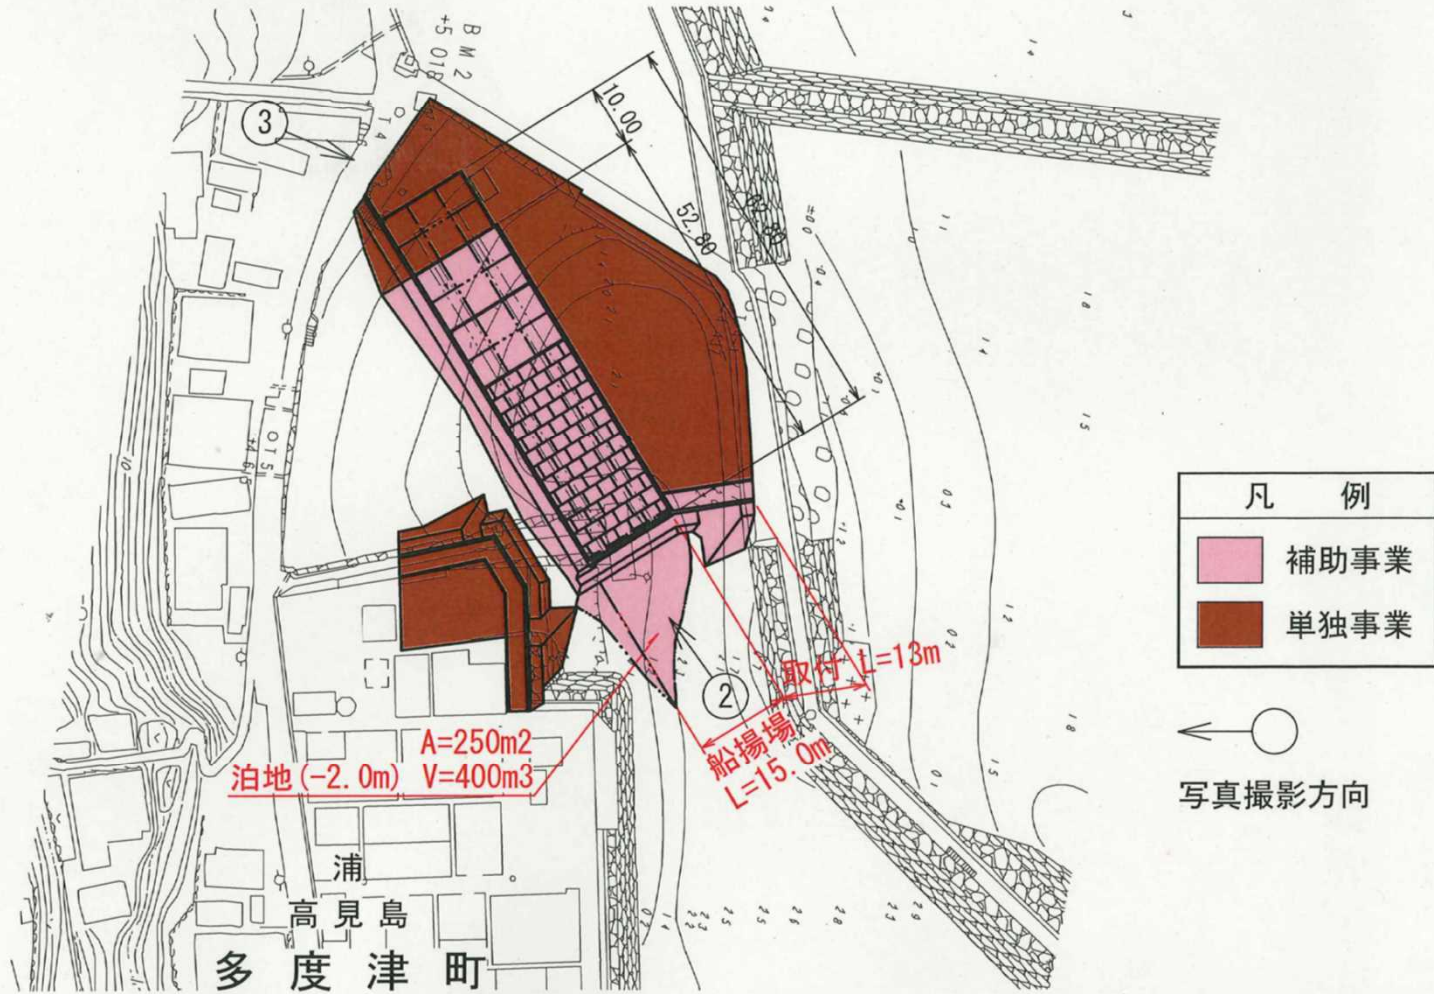

事業概要

・整備前

①




②



・整備後

①

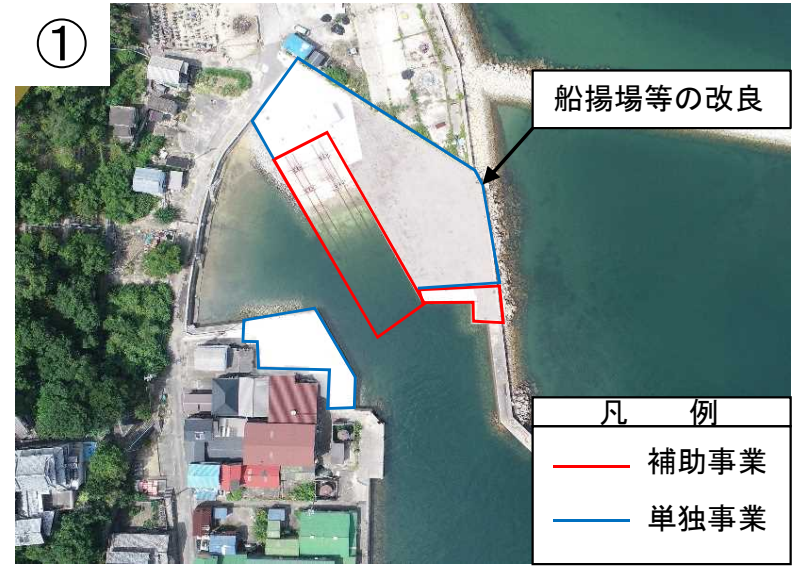

②



事業概要

・整備前



・整備後

