

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

みどり豊かで文化を育むまちづくり(2期)

高松市都市整備局
公園緑地課

計画の名称	1 みどり豊かで文化を育むまちづくり（2期）				
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	高松市		
計画の目標					

第二次高松市みどりの基本計画に基づき、一人当たりの公園面積の少ない小学校区に住区基幹公園の整備を行い、地域住民の憩いと交流の場を提供することや、歩行者空間に緑化施設を充実させることにより潤い豊かな歩行者空間を整備し人の流れを創出するとともに、グリーンインフラの特性を生かした施設を整備することにより、防災・減災対策を図る。また、高松市中心市街地に位置する中央公園（地区公園）において、公募設置管理制度による公園北側エリアの再整備に併せて、公園全体の機能や配置の再編を図ることで、公園の魅力向上と中心市街地の活性化を図る。

1. 事業効果の発現状況： 一定の効果があった

1人当たりの公園面積の少ない小学校区において、新規公園3箇所の開設により、地域住民に憩いと交流の場を提供することができた。

計画の成果目標（定量的指標）											
<ul style="list-style-type: none"> ・整備した公園の利用者数の増加 ・公園から排出される雨水流出量の削減 ・整備路線における歩行者数の増加 ・ユニバーサルデザイン化に対する利用者満足度 ・来街者の中央公園利用割合 											
定量的指標の定義及び算定式											
定量的指標の現況値及び目標値											
		当初現況値 (R2当初)		中間目標値 (R4末)		最終目標値 (R6末)		達成率	備考		
整備した公園の利用者数		目標値：0人 達成値：0人		—人		57,000人 49,500人		86.8%			
従前従後の雨水流出量の削減値		目標値：0.20 m3/S 達成値：0.20 m3/S		0.15 m3/S		0.07 m3/S 0.09 m3/S		84.6%			
整備路線における歩行者数		目標値：3,943人 達成値：3,943人		—人		4,650人 3,943人		0.0%			
アンケート調査によるユニバーサルデザイン化に対応した施設利用者の取り組みに満足した割合		目標値：0% 達成値：0%		—%		80% 0%		0.0%			
来街者の内、再整備後、中央公園を利用するようになった人の割合		目標値：5% 達成値：5%		—%		30% 5%		0.0%			
全体事業費		合計 (A+B+C) 756百万円		A 756百万円		B 百万円		C 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 0.00%	進捗率 (事業費ベース) 90%
実施事業費		合計 (A+B+C) 684百万円		A 684百万円		B 百万円		C 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 0.00%	

交付対象事業																	
A 1 砂防事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
A-12-001	公園	一般	高松市	直接	高松市	高松市都市公園安全・安心対策事業	公園施設更新 1.4箇所	高松市	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	166	166	100%	R3他事業へ移行
A-12-002	公園	一般	高松市	直接	高松市	高松市グリーンインフラ事業	住区基幹公園整備 4箇所 公共公益施設の緑化 3.1路線	高松市	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	566	494	87%	
A-12-003	公園	一般	高松市	直接	高松市	高松市都市公園ストック再編事業	公園再整備 3.5ha	高松市	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	24	24	100%	R6他事業へ移行
小計												756	684	90%			
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
C 効果促進事業（該当なし）																	
その他関連する事業（該当なし）																	
合計																	

要素事業の事業進捗
概ね計画通り進捗
・予算確保が十分でなかった部分については次年度に確保し整備を進めるため概ね計画どおり進捗している

2. 今後の方針
継続
・市内の1人当たりの公園面積の少ない小学校区において、住区基幹公園の整備を進めていくが、人口減少・少子高齢化が進展する中、公園利用者の減少や公園愛護会などのボランティアの担い手不足といった課題が顕在化しているため、今後は既存公園の廃止や統合、既存公園の再整備も合わせて検討しつつ、公園の整備を進めていくとともに、計画目標通りの予算確保に努める。

事後評価書参考資料


■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

みどり豊かで文化を育むまちづくり(2期)

高松市都市整備局
公園緑地課


位置図

- ① 安全安心対策事業
- ② グリーンインフラ事業
- ③ ストック再編事業

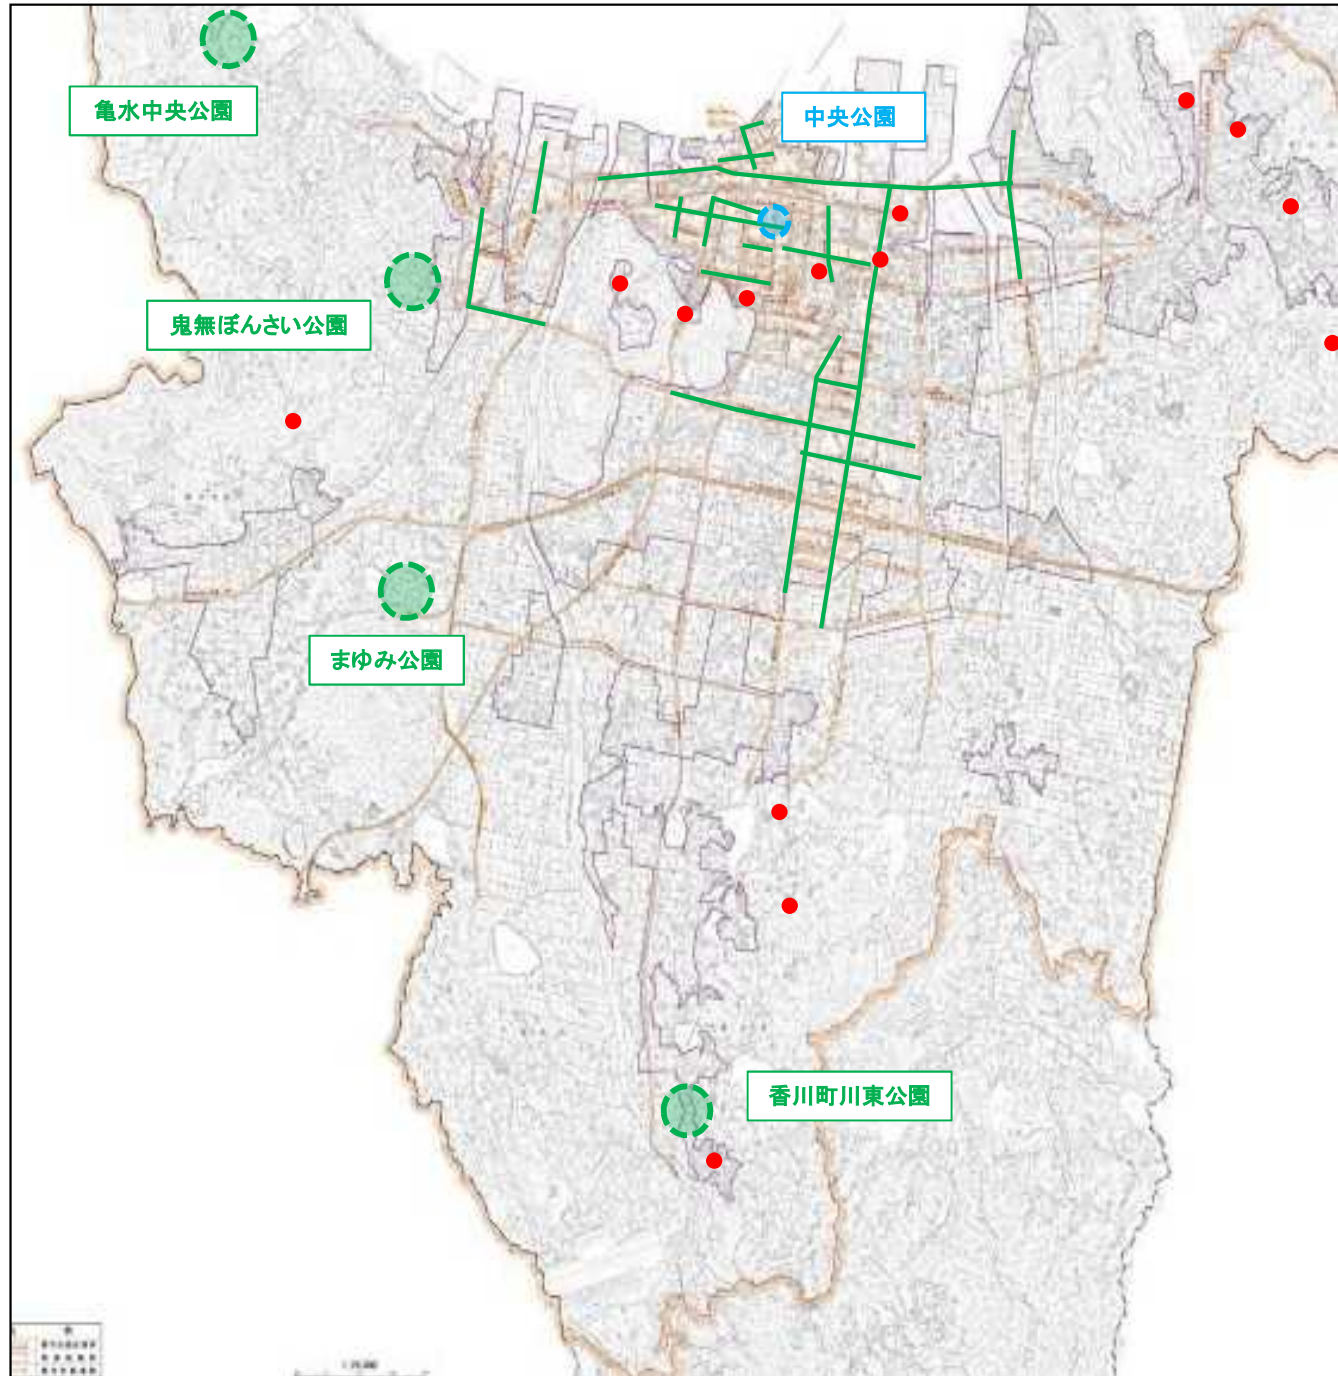



位置図

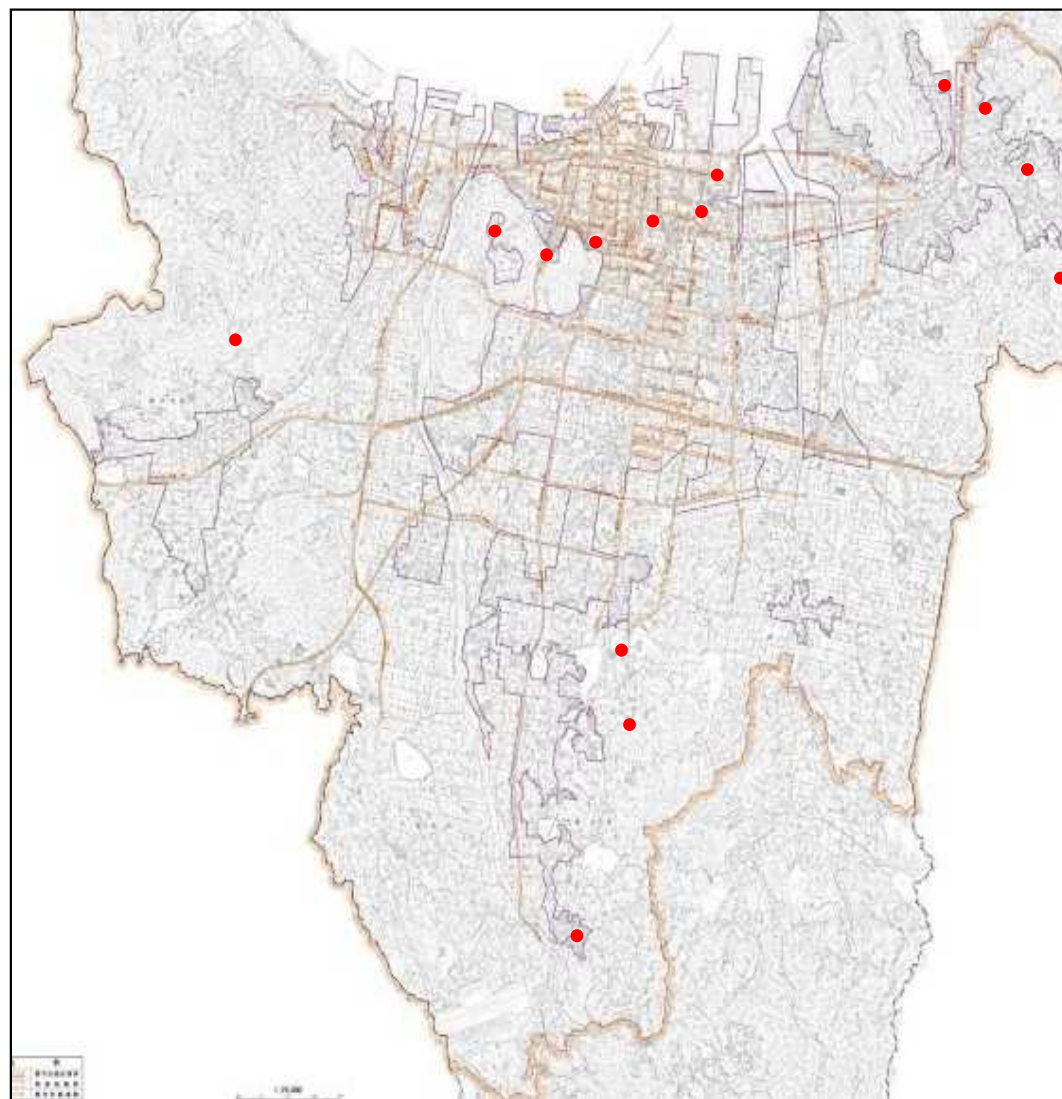

【①安全安心対策事業】

事業概要

公園施設改修

N=14箇所

【沖松島南公園】




【仏生山公園】





位置図

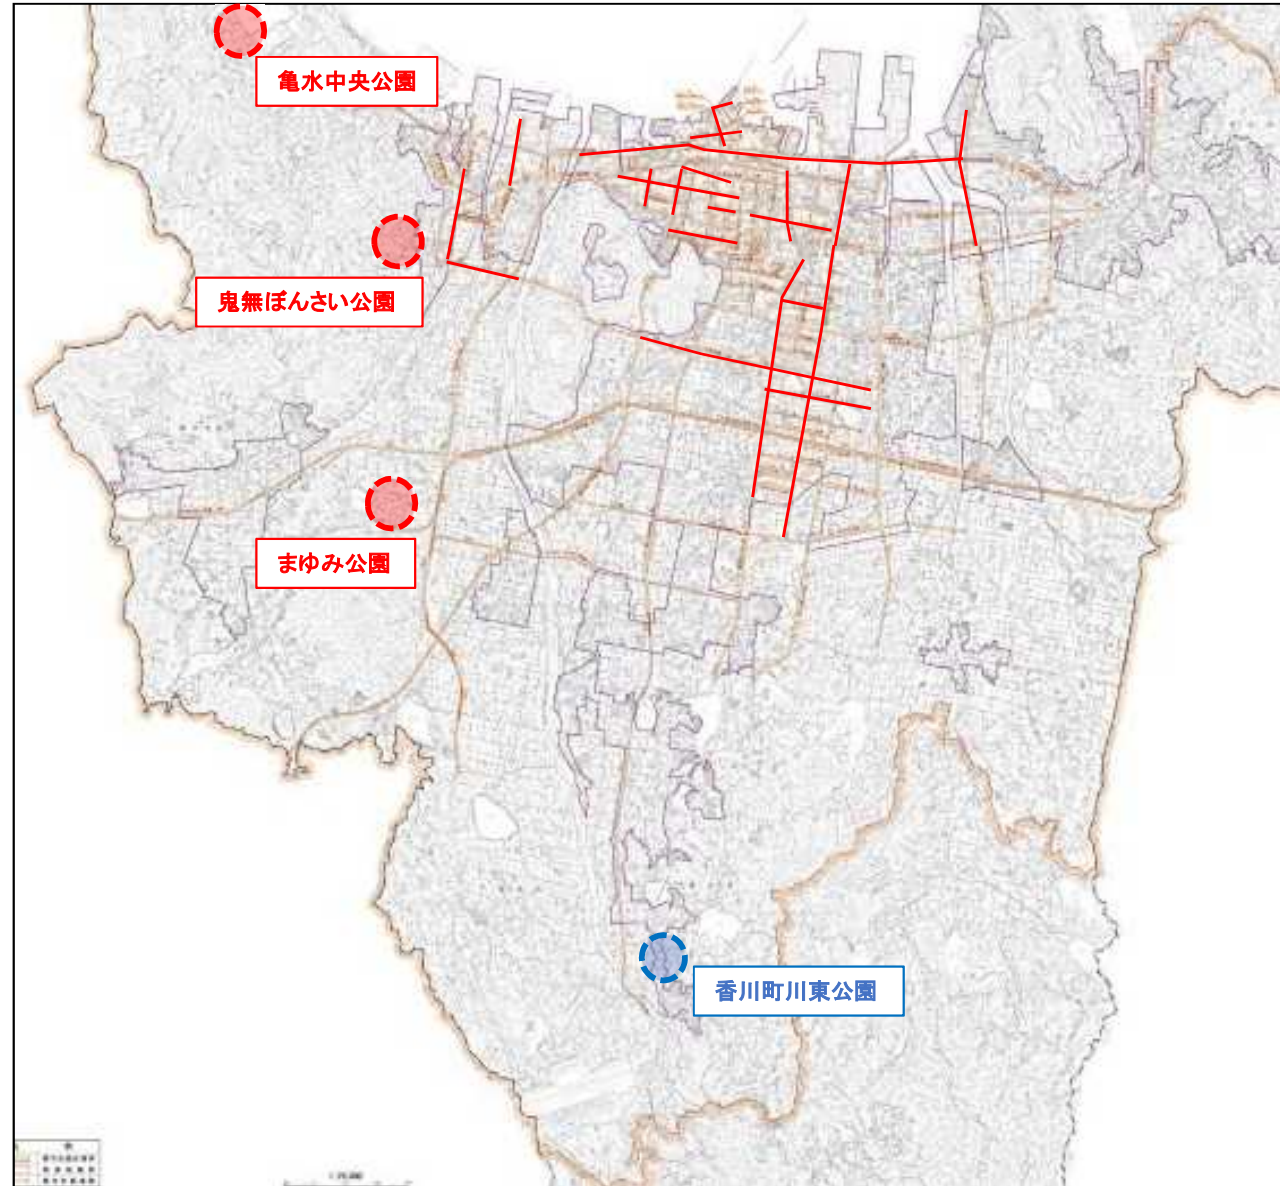

【②グリーンインフラ事業】 事業概要

住区基幹公園整備 N=4箇所

【鬼無ぼんさい公園】



街路樹管理・再整備計画



【③ストック再編事業】

事業概要

公園再整備 N=1 箇所 (3.5ha)

【整備後イメージ図(夜間)】



【整備後イメージ図(カフェ)】



位置図

