

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

防災拠点となる公園づくり（防災・安全）

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

令和6年10月4日

計画の名称	防災拠点となる公園づくり (防災・安全)			重点配分対象の該当	○
計画の期間	令和元年度 ~ 令和5年度	交付対象	香川県丸亀市		
計画の目標					

丸亀総合運動公園は丸亀市の中央部に位置し、スポーツ活動を中心とした総合的なレクリエーション空間として整備しているが、近いうちに発生が懸念されている南海トラフ地震など大規模災害に対する備えを緊急に整備する必要がある。
そのため、丸亀市地域防災計画に基づき、本公園を広域防災拠点と位置づけ、平常時は多目的広場として、災害発生時には広域的な救護救援活動、復旧・復興活動等の活動拠点として整備を行う。

1. 事業効果の発現状況 : 十分な効果があった
- ・多目的広場を整備したことで災害時の消防隊等の集結地、災害緊急物資の搬入搬出車両の駐車スペースが確保できた。
 - ・屋根付き広場を整備したことで、災害緊急物資の荷捌き場を確保できた。

計画の成果目標 (定量的指標)

- ・災害時における救援隊等の集結地、駐車場を確保する。
- ・災害緊急物資の荷捌き、搬入、搬出、大型車両の駐車等のスペースを確保する。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値	中間目標値	最終目標値	達成率
(H30当初)	(H31末)	(H33末)	

災害時の救援隊等の集結地として大型車両等駐車スペースの確保 「防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン (改訂第2版)」を踏まえて60台として設定	目標値:	0台	0台	60台	148%
	達成値:	0台	0台	89台	
災害緊急物資の搬入、搬出に伴う大型トラック等駐車スペースの確保 「防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン (改訂第2版)」を踏まえて60台として設定	目標値:	0台	0台	60台	148%
	達成値:	0台	0台	89台	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,236百万円	A	1,236百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	-	進捗率 (事業費ベース)	82.7%
実施事業費	合計 (A+B+C+D)	1,022百万円	A	1,022百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	-		

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R1	R2	R3	R4	R5				
1-A-1	公園	一般	丸亀市	直接	丸亀市	丸亀総合運動公園	多目的広場整備 他	丸亀市						1,236	1,022	82.7	用地取得難航による工事遅延、請負残の発生等による
合計													1,236	1,022	82.7		

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R1	R2	R3	R4	R5				
合計																	

C 効果促進事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R1	R2	R3	R4	R5				
合計																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R1	R2	R3	R4	R5				
合計																	

要素事業の事業進捗

計画通り進捗

- ・用地取得協議が整わず、一部暫定的な整備となった箇所はあるものの、目標としていた大型車両の駐車場のスペース 60台分を確保することができ、最終的には計画通りの進捗となった。

2. 今後の方針

完了

- ・平常時において、市民の身近なスポーツ活動の場、大規模イベント時等の臨時駐車場として利活用を促進し、適切に施設管理を行っていく。
- ・暫定整備箇所については、引続き市単独事業として用地取得、整備完了を目指す。

事後評価書参考資料


■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

防災拠点となる公園づくり（防災・安全）

丸亀市スポーツ推進課

位置図

丸亀市公園配置図

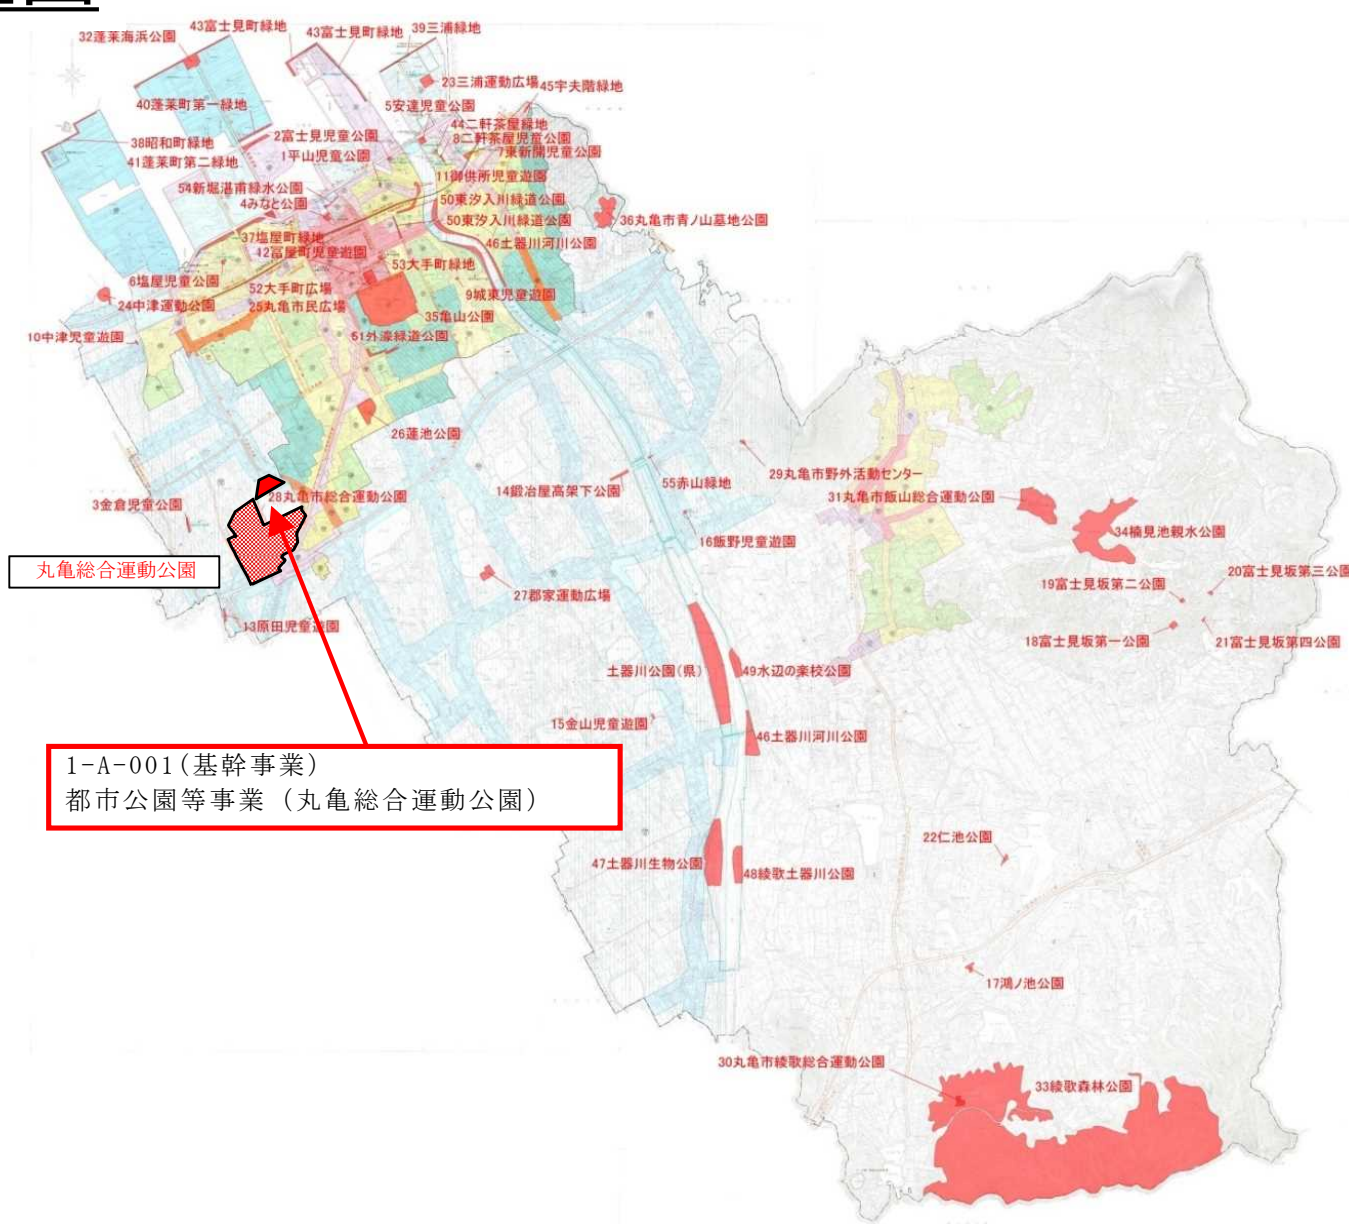

丸亀総合運動公園

1-A-001 (基幹事業)
都市公園等事業 (丸亀総合運動公園)



凡 例	
行政区域	
	第一種低層住居専用地域
	第一種低層住居専用地域
	第一種中高層住居専用地域
	第二種中高層住居専用地域
	第一種住居地域
	第二種住居地域
	準住居地域
	近隣商業地域
	近隣商業地域
	商業地域
	商業地域
	準工業地域
	工業地域
	工業専用地域
	幹線沿道一般型
	一般環境保全型
	大規模集客施設制限地区
	風致地区
	都市計画道路
	公園
	緑地
	墓園
	都市高速鉄道
	その他の都市施設
	人口集中地区(DID地区) H7年国勢調査
	一帯積雪等 形態規制

事業概要

公園事業

- ① 屋根付き広場整備(600m²)、トイレ等整備(78.54m²)、駐車場整備(5,127m²)




災害緊急物資の荷捌場の確保

- ② 多目的広場整備(約14,760m²)



災害時の救援隊等の集結地、災害緊急物資の搬入・搬出のための大型車両等駐車スペースの確保(89台分)

未完了箇所図

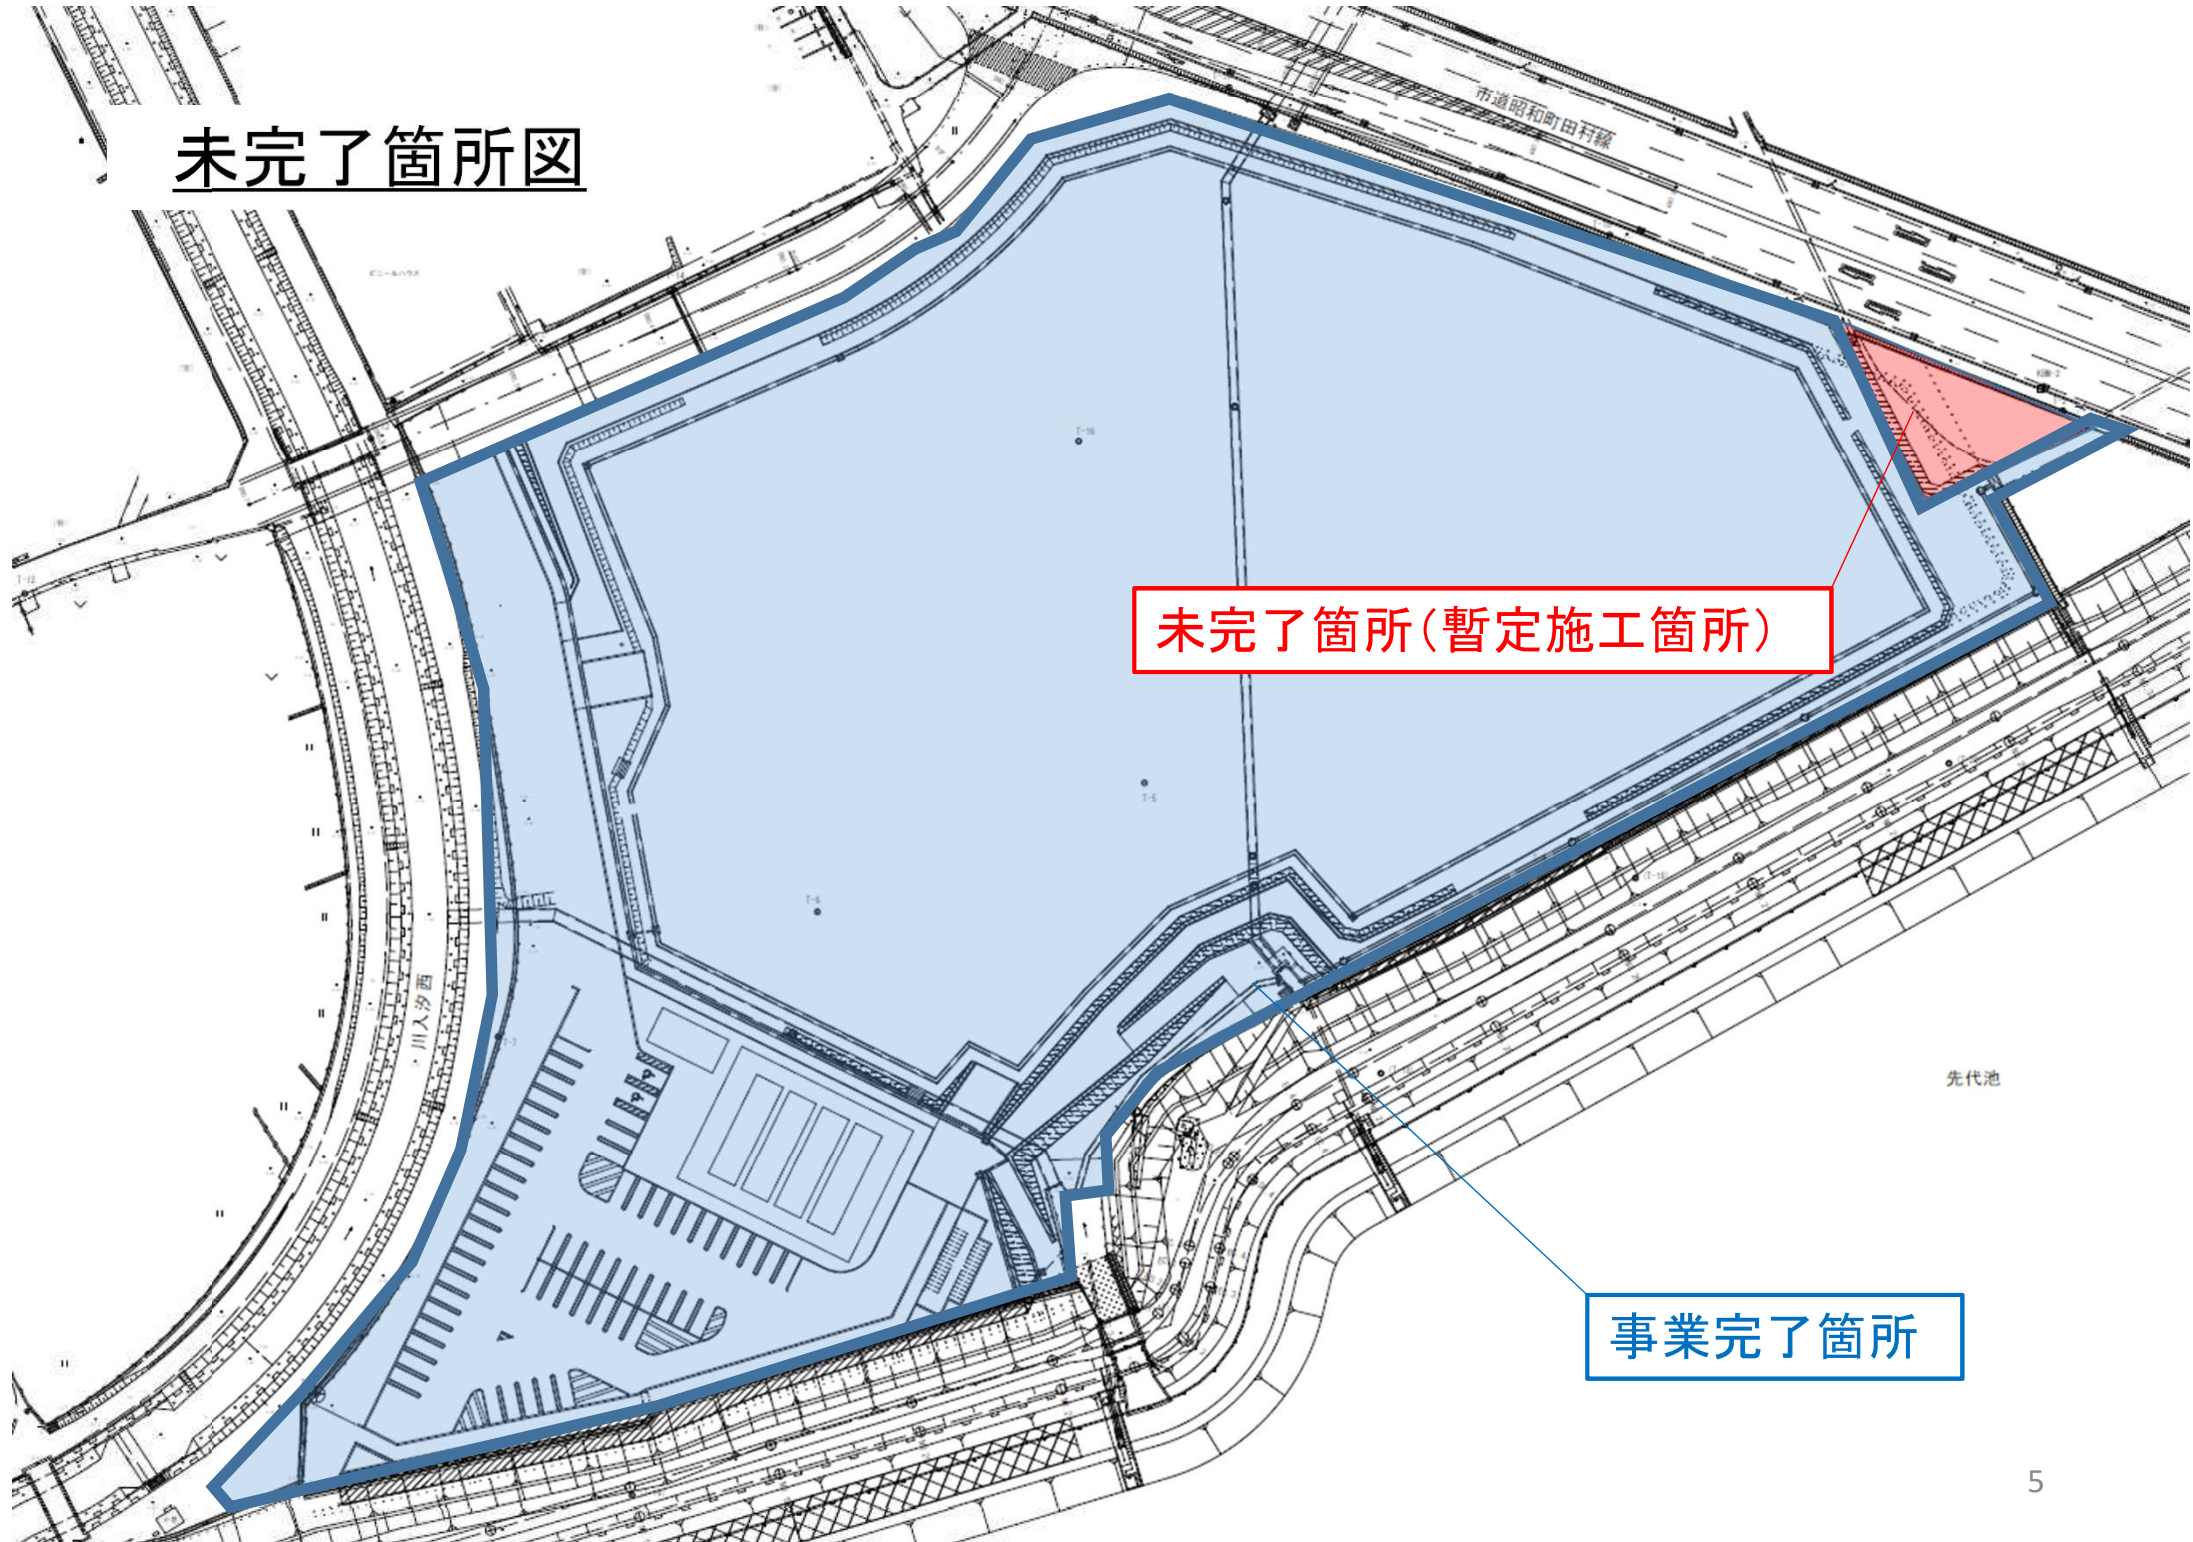

未完了箇所(暫定施工箇所)

事業完了箇所
