

ICT活用工事 現場見学会

○概要

開催日: 令和3年1月13日(水)

工事名: 県道円座香南線(香南工区)道路改築工事(第1工区)

工事場所: 香川県高松市香南町

工事概要: 施工延長 L=157m

(上り線) 土工(掘削) V=900m³、路床盛土V=290m³、路体盛土V=60m³、
側溝工L=2m、補強土壁工1式、

(下り線) 土工(掘削) V=300m³、路床盛土V=350m³、路体盛土V=110m³、
プレキャストL型擁壁L=131m、側溝工L=81m

(ため池浚渫) 土工(掘削) V=500m³

発注者: 香川県高松土木事務所

受注者: 株式会社 村上組

参加者: 14名(施工者4名、県職員10名)

○見学会の内容

【施工者向け】

- ・ 概要説明(ICT活用工事の手続きについて)
- ・ 施工状況の見学(ICT建機による施工状況・出来栄)


【県職員向け】

- ・ 概要説明及び施工状況の見学

○見学会の様子



○平面図

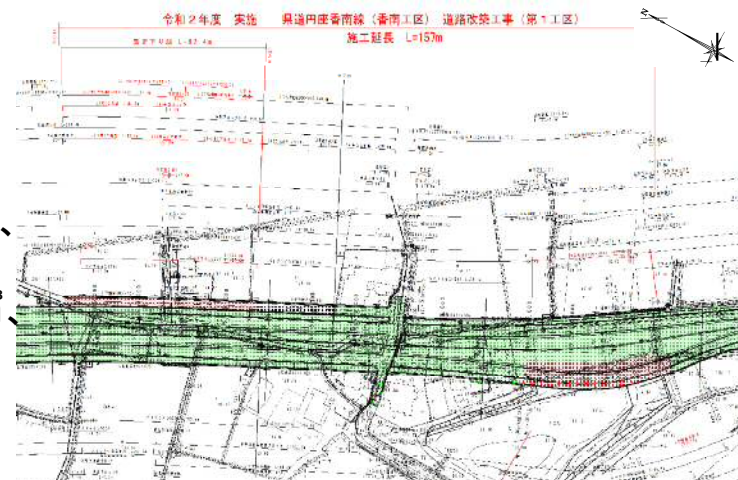

○標準断面図

